

GERER UN PROJET – NOTION DE COUTS, BILAN

I- Bilan de fin de projet

1- Introduction :

Le projet s'est achevé par une réception des travaux accompagnée des dernières vérifications. Dès lors, il vous appartient de réaliser le bilan du projet capable d'apporter une valeur ajoutée à votre organisation de travail. Il s'agit de retenir les éléments positifs et négatifs liés au déroulement du projet. Le bilan de fin de projet se caractérise par un document qui récapitule les informations les plus importantes liées à la réalisation du projet. Il contribue à la capitalisation du savoir-faire et permet d'enrichir le retour d'expérience de l'entreprise. Il s'utilisera donc à la fin du projet. Vous analyserez tout particulièrement le relationnel avec le client, l'organisation projet, l'évaluation des fournisseurs, le bilan financier, la synthèse des problèmes techniques, etc.

Cet outil permettra d'identifier le projet ainsi que les objectifs qui étaient à atteindre. Y seront également mentionnés les contraintes et les moyens qui avaient été mis en œuvre. Le bilan sera dressé sur toutes les phases du projet avec des propositions d'axes de progression. L'exemple utilisé pour illustrer cet outil concerne la construction d'une usine de production.

Exemple :

La première partie de cet outil rappelle le contexte permettant de bien identifier le projet.

A. Besoins

Il s'agit de rappeler brièvement les composantes du cahier des charges, accompagnées des principaux éléments d'information liés au projet en y présentant les contraintes de coût, de délais et des moyens mis à disposition.

Exemple :

L'entreprise GALLETI, dont le siège est basé à Issy-les-Moulineaux, est une biscuiterie en pleine évolution. Pour faire face à un accroissement de la demande, l'entreprise a souhaité augmenter sa capacité de production en construisant une usine en Alsace au contact de la frontière allemande. Les délais donnés au maître d'œuvre se limitent à dix mois. Le budget de l'opération atteint 1,2 million d'euros

B. Intervenants

Il s'agit de présenter les principaux intervenants du projet.

Exemple :

Responsable production : Sylvain DUMONT.

Responsable qualité : Stéphanie MARCHAND.

Responsable projet : François BRECHINT.

Si l'entreprise a fait appel à des sous-traitants, il est important que leurs noms soient également mentionnés par souci de compréhension. En effet, il est possible qu'une entreprise ne respecte pas les clauses du cahier des charges entraînant des dysfonctionnements dans le projet. À ce titre, il est fort utile de les présenter dans le cadre du bilan de fin de projet afin de définir ensuite les responsabilités de chacun mais aussi et surtout pour rappeler le nom de la personne à contacter en cas de question.

Exemple :

L'entreprise GALLETI s'est adjoint les services des entreprises NORMINA et BREUKARD pour respectivement construire l'usine et installer l'unité de production.

C. Équipe maintenance

Il s'agit de présenter les principaux intervenants. L'équipe maintenance est associée au projet en amont afin de garantir une optimisation de l'unité de production dès ouverture de la ligne.

D. Garanties

Il s'agit de présenter les éléments relatifs aux engagements du cahier des charges concernant la garantie des produits commandés.

Exemple :

La garantie sur la réalisation est accordée pour une durée d'un an sur site, pièces et main-d'œuvre comprises. Le service après-vente est assuré par l'équipe maintenance de notre société.

E. Maintenance

Il est également conseillé de rappeler dans le bilan les engagements contractés avec l'équipe maintenance pour justifier son intervention dès réception du produit.

Exemple :

La maintenance est assurée par l'équipe maintenance de notre société durant et après la garantie. Les pièces d'usure sont disponibles auprès des fournisseurs pour une durée de dix ans (à compter de la date d'achat). Le transfert de compétence a été réalisé vers l'équipe maintenance le 10/06/2014.

2. Bilan

La deuxième partie concerne plus particulièrement le bilan du projet. Une évaluation présentée sous forme de tableau nous permet d'évaluer chaque critère par une note. La somme des notes définissant chaque critère nous donne une note moyenne du projet. Chaque note peut être accompagnée d'un commentaire.

Exemple :

Thèmes	Note/10	Commentaires
Global		
Tenue des objectifs	10	Atteint
Respect des délais	10	Atteint
Respect des coûts	5	Petit dérapage : sous-estimation de la charge
Pilotage du projet	9	Respect des procédures
Encadrement des équipes	9	Bonne ambiance
Moyens humains		
Prestation de sous-traitance		Pas de sous-traitance
Prestation des intervenants Internes	10	Rigueur et autonomie
Nombre d'intervenants internes	10	Nombre suffisant compte tenu des objectifs
Disponibilité des équipes internes	10	Excellente souplesse
Logistique	8	Bonne, problème de distance qui a limité le nombre de réunions
Financier		
Marge financière	0	
Échéancier de paiement	5	Aurait dû être mieux négocié (délais plus courts)
Mode de règlement	5	Par chèque 30 jours

Plan de financement	-	
Pénalités	-	
Assurances	-	
Délais		
Délais fournisseurs	-	
Échéancier projet	10	Délais respectés
Livrables		
Qualité des fournitures reçues	8	Tous les outils ont dû être repris (charge supplémentaire non prévue)
Qualité de la réalisation	10	Supérieur à ce qui avait été demandé
Documentation reçue	8	Suffisante pour lancer des pistes de réflexion
Documentation livrée	9	Insuffisante sur la partie méthodologie
Respect des normes		
Sécurité	-	
Environnement	-	
Technique	6	Manque de connaissances techniques malgré un résultat visuel livré, de très bonne qualité
Juridique (contrat)	-	
Plan qualité	10	Respecté
Travail	10	
Risques		
Financier	-	
Environnemental	-	
Technique	8	Peu élevé, de nombreux tests se sont révélés positifs
Calendaire	9	Juste à temps
Client		
Satisfaction globale	10	
Disponibilité	9	Prêt à s'investir
Négociation	9	Reste ouvert à la négociation sauf pour les délais
Contact relationnel	9	Ne pose aucun problème
Solvabilité financière	-	
Expression des besoins	10	Excellent cahier des charges
Note moyenne du projet:	9	

3. Synthèse des problèmes techniques

Les troisième et quatrième parties permettent une meilleure prise en compte du retour d'expérience. Il s'agit de relever les différents problèmes rencontrés et de présenter les solutions apportées.

A. Identification du/des problèmes

Exemple :

Le principal problème rencontré concerne le non-respect des délais engagé par l'entreprise BREUKARD qui n'a pas livré l'unité de production en temps voulu.

B. Solution(s) mise(s) en œuvre

Exemple :

Nous avons décidé de faire jouer la clause suspensive présente dans notre contrat nous liant à l'entreprise BREUKARD. Il a été décidé de se rapprocher vers la deuxième proposition de l'entreprise TRIMBAURD qui proposait une offre moins chère mais plus longue dans le temps.

4. Démarche de progression

Rubrique : Global
À poursuivre et intensifier : Gestion des risques La réactivité de l'équipe projet a été un facteur clé de la réussite du projet. Poursuivre par l'intégration systématique des risques dans la gestion de projet.
À revoir : Choix de l'entreprise Apporter encore plus de vigilance dans le choix de l'entreprise. Créer une cellule de veille vis-à-vis des expériences passées.

5. Diffusion et validation

Enfin, la cinquième partie concerne la validation du bilan par les personnes internes ayant besoin de ce bilan projet

Exemple :

	Date	Visas
Responsable de production: Sylvain DUMONT	12 juillet 2014	
Responsable qualité: Stéphanie MARCHAND	17 juillet 2014	
Responsable du projet: François BRECHINT	20 juillet 2014	

En pratique :

Il est déconseillé de :

- Rédiger le bilan en aparté, sans consulter le groupe projet. Le bilan risquerait de souffrir d'un manque d'objectivité, de ne pas être exhaustif et, surtout, de ne pas être accepté par l'équipe projet.
- Rédiger le bilan sans s'appuyer sur les outils précédemment réalisés. Des outils de communication ont été rédigés en amont du projet, notamment le tableau de bord. Ne pas s'appuyer sur ces outils entraînerait une perte de temps non négligeable.

Principe :

Il est conseillé de faire partager les connaissances acquises lors du déroulement du projet. Ces connaissances partagées permettent au groupe projet d'optimiser l'organisation de l'entreprise.

Astuces :

- Appuyez-vous sur les documents écrits durant le projet : compte rendu de réunion, tableau de bord, note de synthèse...
- Convoquez les principaux acteurs du projet lors d'une réunion de prébilan pour échanger les avis sur le déroulement du projet avant de transmettre le bilan définitif.

L'essentiel :

- Ce document s'utilise à la fin du projet.
- C'est le principal outil caractérisant le retour d'expérience.
- Vous analyserez tout particulièrement le relationnel avec le client, l'organisation projet, l'évaluation des fournisseurs, le bilan financier, la synthèse des problèmes techniques, etc

II – Évaluation des sous-traitants

Lorsqu'un projet atteint une certaine taille, il est souvent fait appel à des sous-traitants. En réalisant des fiches d'évaluation de ses sous-traitants et en conservant l'ensemble de ces évaluations, l'entreprise se constitue une base de connaissances précieuses, qui pourra être utilisée lors de nouveaux projets sollicitant le même style de prestations. Ce document, qui peut être transmis au sous-traitant, s'inscrit par ailleurs dans un cadre d'assurance qualité, tant du point de vue du client que du fournisseur de la prestation. La sous-traitance sous-entend automatiquement une prestation de service. On jugera donc, non le matériel utilisé mais plutôt la qualité du service rendu et, par conséquent, l'entreprise sous-traitante.

Ce document est réalisé après tous les autres documents contractuels, plusieurs mois parfois après la clôture du projet. Toutefois, il vaut mieux ne pas trop attendre pour le rédiger, car plus le temps passe, plus il est difficile de conserver une vision juste et d'apprécier avec finesse la prestation du sous-traitant. Cet outil se compose idéalement de trois documents afin d'être complet : un courrier d'accompagnement, la fiche d'évaluation et la fiche d'analyse.

1. Le courrier d'accompagnement

Il s'agit d'une simple lettre d'introduction à joindre aux deux autres documents, dont la signature est la même que celle figurant sur la fiche d'évaluation validant l'ensemble des documents « Évaluation des sous-traitants ».

Exemple :

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint votre évaluation de sous-traitant effectuée par nos soins, qui concerne la période du 01/02/2014 au 25/06/2014 et l'activité suivante : « Installation du système d'alerte évacuation du Centre technique ». Nous vous prions d'en prendre connaissance et sommes à votre disposition pour un échange particulier à ce sujet afin que chaque point puisse être abordé par les deux parties. Nous attendons un courrier de réponse de votre part sous 30 jours, qui nous indique les mesures d'amélioration envisagées pour les différents thèmes dont l'indicateur de suivi se trouve être inférieur à 10.

Dans l'attente, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

LOGO		FICHE D'ÉVALUATION SOUS-TRAITANT						
A : OBJECTIFS DÉPASSÉS B : OBJECTIFS ATTEINTS C : RÉSERVES FREQUENTES et/ou RÉGULIÈRES D : NON CONFORME E : SANS OBJET		OBJET	Évaluation					OBSERVATIONS OU RÉSERVES (requis quand note C, D ou E)
			A	B	C	D	E	
SÉCURITÉ	Respect des consignes	Spécifications client, aspects réglementaires, POP, balisage, énumération		X				Un électricien n'a pas pu nous fournir son titre d'habilitation. Il l'a toutefois apporté et conservé sur lui le lendemain.
	Propreté / Environnement	Respect de l'environnement du chantier avant, pendant et après l'intervention et gestion des déchets		X				
QUALITÉ	Formation	Habilitations diverses et gestion du suivi				X		Le cahier des charges (paragraphe 2.5) exigeait un rapport hebdomadaire. Les rapports n'étaient fournis que 2 fois par mois. Ils étaient toutefois complets.
	Conformité au cahier des charges	Respect du cahier des charges				X		
TECHNIQUE	Respect des procédures	Procédures, processus et aspect réglementaire		X				Excellent management de projet, chef de projet toujours disponible. Félicitations !
	Documents	Qualité de l'identification, de la traçabilité et des documents		X				
DÉLAIS	Compétences	Aptitude à réaliser les travaux, analyse des besoins, suivi d'affaire		X				2 mois de retard sur le planning sans que cet aspect primordial ne soit clairement averti, pas même dans les rapports de réunion.
	Encadrement	Présence de l'encadrement, participation à la résolution des éventuels problèmes rencontrés		X				
PRIX	Outils / Moyens	Moyens adaptés à la prestation et conformes à la réglementation		X				Le documents TQC prévus 2 semaines après la réception finale (voir cahier des charges § 6.4) ne nous sont parvenus que 2 mois après la réception finale.
	Respect des délais	Délais de réalisation (planification - exécution)				X		
	Remise des documents	Dans les délais contractuels				X		Les travaux supplémentaires facturés dépassent le lot prévisionnel.
	Disponibilité	Souplesse d'adaptation aux interventions ponctuelles				X		
	Respect des prix	Par rapport à la prestation réalisée et/ou cahier des charges						
	Rapport qualité / prix	Indice de satisfaction globale				X		

Sous-traitant et/ou fournisseur :		Rédigé par :	
Nom du prestataire : MDP S.A.		Nom : S. BOURDON	
Activités : Remplacement des cellules haute tension et transformateurs		Service : Dpt Ingénierie	
Période : 01/02/2014 - 26/06/2014		Date : Lundi 8/8/2014	
Note finale : 16/18		Visa :	
Action corrective :		Document à retourner au Resp. Qualité pour résultat de l'évaluation. Si note globale < 10/20 (voir fiche d'analyse) ou si au moins une note = E, demander la mise en place d'actions correctives pour les prochaines prestations et procéder à une nouvelle évaluation dès le début de la nouvelle prestation.	

2. La fiche d'évaluation

C'est le document le plus important de tous ceux transmis. On y précisera 5 aspects concernant la prestation réalisée :

- Sécurité :
 - respect des consignes ;
 - propreté/environnement ;
 - formation ;

- qualité.
- Conformité au cahier des charges :
 - respect des procédures ;
- documents.
 - Technique
 - compétences ;
 - encadrement ;
 - outils/moyens.
 - Délais
 - respect des délais ;
 - remise des documents ;
 - disponibilité.
 - Prix
 - respect des prix ;
- rapport qualité/prix

La colonne Objet permet de donner des précisions sur l'aspect considéré. Dans la colonne Évaluation, est indiquée la note donnée au sous-traitant (de A, la meilleure note à D, la plus mauvaise) :

- A : Excellent, objectifs dépassés.
- B : Bien, objectifs atteints.
- C : Moyen, prestation à la limite des engagements.
- D : Insuffisant, prestation pas en accord avec le contrat, prestation à revoir.
- E : Non applicable, sans objet.

Exemple :

Une entreprise peut décider que ses critères d'évaluation seront :

A = Objectifs dépassés

B = Objectifs atteints

C = Réserves fréquentes et/ou régulières

D = Non conforme

E = Sans objet

La colonne Observation n'a pas à être systématiquement remplie mais, dans tous les cas, elle le sera si l'évaluation se situe entre C et D. Dans ce cas, le commentaire sera à la fois court et précis : on part du principe que le point a déjà été abordé en cours de projet. Il est intéressant de noter les éventuelles exigences contractuelles qui n'ont pas été respectées.

Exemple :

Observations ou réserves : retard sur le planning de plus de 2 mois, prestation surfacturée...

La partie Sous-traitant et/ou fournisseur fera apparaître le nom du contractant, l'activité qu'il exerce dans le cadre du projet et la période sur laquelle porte l'évaluation de ce fournisseur (en général la durée totale de sa prestation). La partie Signature est remplie par le chef de projet, qui pilote le contrat de sous-traitance.

Ce document sera transmis au sous-traitant et une copie adressée au Responsable qualité pour information. Si le résultat est inférieur à 10/20 (voir ci-après la fiche d'analyse), ou si au moins

l'une des notes est égale à D, il est nécessaire de mettre en place des actions correctives afin de procéder à une nouvelle évaluation dès le démarrage d'une éventuelle nouvelle prestation. On peut éventuellement demander au prestataire une réponse écrite concernant le ou les point(s) dont l'évaluation est inférieure ou égale à 10/20, et ce même si l'ensemble de la prestation a été évalué à plus de 10/20.

3. La fiche d'analyse

Cette fiche a pour but d'effectuer la synthèse des résultats obtenus au travers de la fiche d'évaluation. Elle n'est pas obligatoire mais elle permet, comme nous le verrons plus loin, d'affiner le résultat. Pour pouvoir réaliser cette synthèse et calculer un taux de réussite, il faut transformer les notes de A à E en valeurs numériques en prenant comme postulat : A = 20 ; B = 15 ; C = 10 ; D = 5 ; E = sans objet (non applicable). Ce qui fait la plus-value de ce document c'est que l'on valorise chacun des critères en le multipliant par un niveau de criticité. On prend, par exemple, 3 niveaux de criticité : Mineur (1), Majeur (2), Impérieuse (3).

Comme pour l'Outil décisionnel, la criticité est le coefficient d'importance que l'on accorde à un point en particulier. Par exemple, si le respect des consignes de sécurité est un point incontournable et essentiel, on lui attribuera une valeur de 3. Si par contre les outils et moyens ne sont pas un critère très important, une valeur de 1 leur sera attribuée. Le résultat final est la moyenne de l'ensemble des points obtenus.

En pratique :

À éviter :

Oublier de transmettre les données au sous-traitant ne permettra pas à ce dernier de s'améliorer.

Principe :

Cet outil permet de jauger un sous-traitant d'après la prestation qu'il a réalisée et de consolider les aspects positifs et négatifs de cette réalisation afin de mieux choisir ses sous-traitants dans le cadre de futurs projets.

Astuces :

- Inscrire l'évaluation des sous-traitants dans le cadre d'une assurance qualité assure un retour d'expérience dans le temps de la part des entreprises sous-traitantes.
- L'évaluation des sous-traitants offre la possibilité d'éventuelles négociations plus intéressantes avec eux pour les futurs projets.
- Cet outil permet aussi de justifier les possibles malfaçons apparaissant ultérieurement et d'apporter ainsi un élément supplémentaire en cas de recours nécessaire.

Essentiel :

- Outil qui permet de juger de la qualité de la prestation d'un fournisseur.
- En dessous d'un résultat de 10/20 ou lorsqu'une note est égale à D, mettre en place des actions correctives.
- Utiliser un niveau de criticité différent suivant l'importance du point considéré.
- Transmettre une copie au sous-traitant et une au service qualité

LOGO

FICHE D'ANALYSE

		Cases à cocher					Résultats	Criticité	Evaluation	Moy.
		A	B	C	D	E				
SÉCURITÉ	Respect des consignes:	00	X	00	00	00	15	3	45	11,25
	Propreté/Environnement:	00	X	00	00	00	15	2	30	
	Formation:	00	00	X	00	00	5	3	15	
QUALITÉ	Conformité au cahier des charges:	00	00	X	00	00	5	3	15	10,71
	Respect des procédures:	00	X	00	00	00	15	2	30	
	Documents:	00	X	00	00	00	15	2	30	
TECHNIQUE	Compétences:	00	X	00	00	00	15	3	45	16,67
	Encadrement:	X	00	00	00	00	20	2	40	
	Outils/Moyens:	00	X	00	00	00	15	1	15	
DÉLAIS	Respect des délais:	00	00	00	X	00	00	3	00	3,75
	Remise des documents:	00	00	00	X	00	00	3	00	
	Disponibilité:	00	X	00	00	00	15	2	30	
PRIX	Respect des prix:	00	00	X	00	00	5	1	5	10,00
	Rapport qualité/prix:	00	X	00	00	00	15	1	15	
Indicateur global										10,48

Légende:

Cases à cocher :

A équivalent à 10

B équivalent à 5

C équivalent à -5

D équivalent à -10

E équivalent à 0

Criticité :

1 - MINEURE


2 - MAJEURE

3 - IMPERIEUSE

Notation :


Total Maximum : 20

Total Minimum : 0

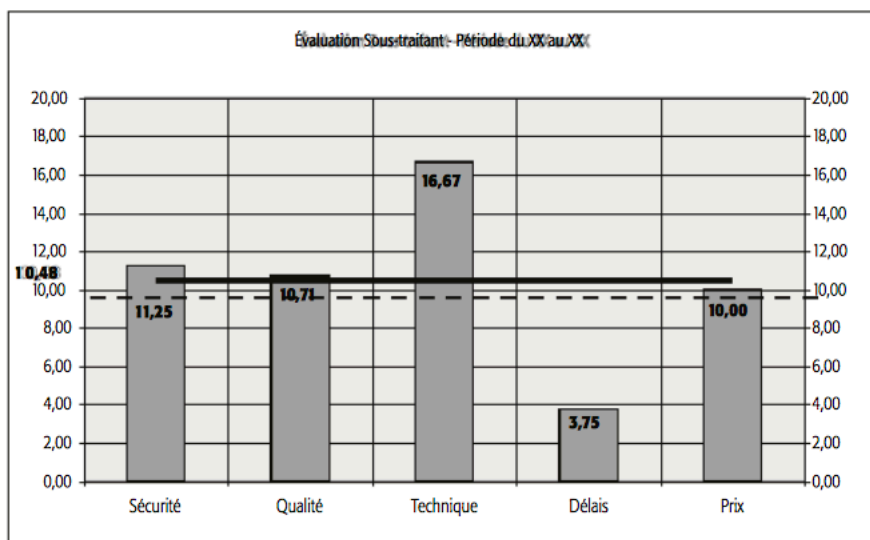

III – Fiche d'évaluation , communication projet

Un projet est jalonné de différentes étapes de communication nécessaires dans un processus de transmission de l'information. L'objectif est, pour le chef de projet, de ne pas se limiter à faire savoir, mais aussi et surtout de faire participer l'équipe projet et susciter l'adhésion. La fiche d'évaluation communication projet va permettre de mesurer sa communication en listant et hiérarchisant le processus de communication de telle manière à décomposer l'objectif global de communication en sous-objectifs mesurables. Cet outil peut tant servir à une communication interne qu'à une communication externe à l'entreprise. La fiche constituera la mémoire de l'action et de ses performances. De ce fait, elle servira pour les futures opérations de même type au sein du service, voire dans d'autres services de l'entreprise amenés à communiquer.

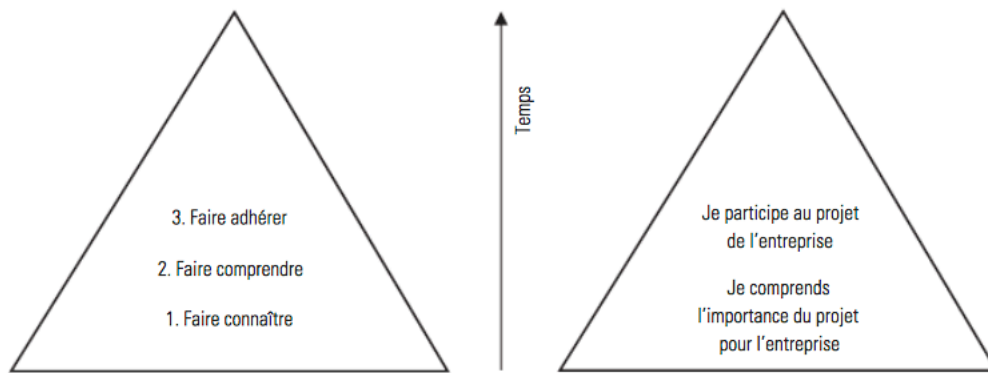

L'objectif de la fiche d'évaluation communication projet

Méthodologie : différentes méthodes peuvent être employées, la plus utilisée étant l'analyse quantitative qui doit être associée à une analyse qualitative. L'analyse quantitative est une aide à la décision qui s'appuie sur des indicateurs de mesure. Elle permet de rendre des comptes, de valider. L'analyse qualitative permet d'assimiler l'information et d'alimenter la réflexion. Pour ce faire, il est nécessaire d'établir un outil de mesure constituant la colonne vertébrale de l'acte d'évaluation de sa communication.

La fiche se décompose en trois parties :

- le descriptif de l'action ;
- le dispositif de mesure retenu ;
- le bilan de l'action.

En pratique :

L'essentiel :

Faire connaître – Faire comprendre – Faire adhérer : l'objectif est, par un outil de communication, de faire participer l'équipe projet en l'impliquant. Associée à un objectif de performance, la fiche d'évaluation communication projet permet de capitaliser par retour d'expérience les forces et faiblesses du projet.

À éviter :

Ne pas multiplier le nombre d'objectifs élémentaires par action au risque de perdre en cohérence.

Conseil :

Quatre objectifs élémentaires par action sont à considérer comme un maximum.

Fiche d'évaluation communication projet			
Intitulé de l'action : invitation à l'inauguration du complexe culturel « le Phare », journée portes ouvertes			
Date(s) : 20 juin 2014	Lieu : Nancy	Responsable de l'action : M. François BRECHINT Directeur du service culturel – ville de Nancy	
Cible(s) : population locale et régionale		Coordonnées : Mairie de Nancy 1 place Stanislas, 54 000 Nancy	
Budget de l'action (en € ou jour/personne) :			
Prévu : 90 000 €		Réel : 88 500 €	
Objectif de communication : faire connaître et adhérer			
Objectifs élémentaires (Chiffrés si possible)	Moyens mis en œuvre	Résultats constatés (observations)	
1. Inviter les forces vives du territoire (partenaires institutionnels, parties prenantes, personnel, presse, médias régionaux et nationaux) et la population	Courrier d'invitation Plaquette	Retour : 18 %	
2. Faire comprendre l'intérêt du projet	Dossier de presse Interview radios et télévision régionales et nationales Discours des élus	Retour presse et médias (régionaux, nationaux) : 20 articles (12 en national)	
3. Faire adhérer la population	Distribution de la plaquette dans tous les foyers de l'agglomération	Nombre de personnes présentes : 12 892 personnes sur la journée	

Le dispositif de mesure			
Outils de mesure retenus	Observations		
Analyse quantitative (questionnaire)	Échantillon : 100	Faibles - Auto-administré	Date : 20 juin 2014 Lieu : Le Phare Questionnaire en face à face à la sortie du complexe culturel
Analyse qualitative (entretien)	Entretien		Date : 27 juin 2014 Lieu : mairie Équipe communication + Direction des services + Élus
Bilan de l'action			
Faits marquants, particularités de l'action : retour très positif. La population a compris l'intérêt de notre projet.			
Difficultés rencontrées : l'afflux de monde. Tensions générées par le retard pris dans la visite de l'équipement. Personnel communal dépassé.			
Ce qui est à renouveler : Le plan média La publication de la plaquette (forme et fond appréciés) = message compris	Ce qui pourrait être amélioré : La gestion du flux de la population : prévoir une pré-inscription de la population avant l'événement et mettre des moyens humains supplémentaires		

IV - Fiche d'évaluation de l'équipe projet

Tenter d'évaluer son équipe projet reviendrait à améliorer la qualité du travail de l'entreprise et participerait au développement professionnel des collaborateurs associés. Engagée dans une démarche d'amélioration continue par retour d'expérience, l'évaluation de l'action de son équipe est jugée particulièrement opportune. Surtout lorsqu'il s'agit d'évaluer l'action de chaque collaborateur dans le projet. Outil propre au domaine des ressources humaines, la fiche d'évaluation des membres de l'équipe projet doit permettre de vérifier que les objectifs sont atteints. Cette fiche d'évaluation de l'équipe projet permet non seulement d'identifier les aspects positifs du travail mené, mais aussi de mettre en évidence les obstacles rencontrés durant la mission et les moyens d'amélioration mis en œuvre pour les lever. Évaluer ses collaborateurs dans la gestion d'un projet, lorsque la mission est en principe dévolue au service des ressources humaines, ne peut se faire sans l'approbation de l'équipe projet. Pour ce faire, il est nécessaire de l'impliquer en amont et de présenter la démarche dans un processus d'amélioration continue de gestion des projets de l'entreprise. Surtout, cela permet de lever les craintes envers le processus d'évaluation et de favoriser la contribution de l'équipe projet.

Dans ce cadre, il peut être envisagé de créer un comité d'évaluation, en présentant les objectifs affichés et la méthode retenue, auquel sera associé un représentant du service des ressources humaines pour valider la démarche. L'élaboration de la fiche d'évaluation, validée par le service des ressources humaines (quand il existe), ne suffit pas à favoriser le processus d'amélioration continue. Elle doit s'accompagner de la « rencontre d'évaluation », une action capitale dans le processus d'évaluation. Cette rencontre est avant tout un dialogue entre l'évalué et le chef de projet qui aura pour but de rappeler les objectifs de l'évaluation, d'exprimer les attentes mutuelles, de souligner la contribution de l'employé dans l'organisation et d'établir un plan d'action en faveur de l'amélioration continue des projets de l'entreprise.

Mais, avant de s'engager dans un processus d'évaluation et de rencontrer ses collaborateurs à cet effet, il est surtout nécessaire de se poser les bonnes questions. Élaborer un processus d'évaluation de son équipe dans le cadre de la gestion de projet revient à se poser 6 questions fondamentales qui vont permettre de constituer sa grille d'analyse :

Pourquoi évaluer ? Déterminer les buts de la politique d'évaluation du personnel.

- Qui évaluer ? Préciser la catégorie du personnel à évaluer.
- Quoi évaluer ? Définir les éléments de l'évaluation : atteintes des objectifs fixés au départ, tâches à accomplir, réactions face aux difficultés, comportements attendus, améliorations apportées...
- Comment évaluer ? Choisir l'indicateur, l'outil adapté : grille d'analyse, questionnaire, autoévaluation, rencontre d'évaluation...
- Quand évaluer ? En gestion de projet, il s'agit de privilégier la fin du projet pour mieux évaluer.
- Quelles suites ? S'inscrire dans un retour d'expérience pour ne plus reproduire les mêmes erreurs : formation, travail sur le comportement, acquisition de matériel...

À partir de cette grille de lecture, il est possible d'arrêter un modèle type d'évaluation de chaque représentant de l'équipe, en mode gestion de projet. Bien entendu, cette grille d'analyse n'est pas exhaustive, mais donne un canevas sur lequel il est possible de s'appuyer pour construire sa propre grille d'analyse, selon le type de projet et la taille de l'entreprise.

En pratique :

Associée à la gestion de projet, l'évaluation des membres de l'équipée sera décomposée en quatre phases :

- La réalisation du projet.
- Les améliorations possibles.
- Les engagements à tenir.
- Le suivi de l'évaluation

Le projet	Chef de projet	Équipier	En commun
Appréciation globale et personnelle dans la réalisation du projet			
Résultat comparé aux attentes et objectifs		x	
Qu'est-ce qui s'est amélioré, quelles ont été les difficultés rencontrées?		x	

Comment l'expliquer?		x	
Appréciation sur la méthode de la gestion du projet		x	
Appréciation sur les moyens mis à la disposition du collaborateur		x	
Avis sur le comportement			
Appréciation sur l'attitude (relation interpersonnelle, avec l'extérieur)	x		
Capacité d'initiative			
Degré d'autonomie, force de propositions, marges de manœuvre	x		
Animation de l'équipe, climat de travail, motivation			x
Communication, écoute, dialogue			x
Pédagogie, souci du partage, soutien aux équipiers			x
Résolution de problèmes ou conflits			x
Capacité à déléguer			x

Inscrire cette action dans une démarche positive. On ne parlera pas de points faibles mais de points à améliorer. Le processus se fait en commun dans le cadre d'une rencontre à l'issue du projet, entre le chef de projet et l'équipier.

Points forts et améliorations possibles	Chef de projet	Équipier	En commun
Points forts de l'équipier			x
Méthode de travail			x
Relation avec l'équipe projet			x
Moyens mis à disposition			x

Les engagements à prendre pour le(s) projet(s) suivant(s) sont aussi discutés et validés lors de cette phase d'entretien. Les propositions qui en ressortiront doivent permettre d'améliorer les résultats et/ou le comportement.

Les engagements à tenir	Chef de projet	Équipier	En commun
Définition de propositions pour améliorer la situation			x
Retranscrire et enregistrer les propositions			x

La fiche d'évaluation n'a de sens que si elle est suivie d'effet. Il est primordial d'assurer une continuité au processus d'évaluation pour rester dans cette dynamique d'amélioration continue. Il en va de la crédibilité du chef de projet.

Le suivi de l'évaluation	Chef de projet	Équipier	En commun
Définir des critères pour mesurer les avancées	x		
Écouter les souhaits de l'évalué	x		
Faire émerger des potentialités inexploitées	x		
Proposer un programme de formation	x		
Rendre compte au service des ressources humaines	x		

L'essentiel :

Outil des ressources humaines appliqué à la gestion de projets, la fiche d'évaluation de l'équipe projet permet de capitaliser les réussites liées à la gestion du projet dans un processus d'amélioration continue. Les difficultés rencontrées sont mémorisées par retour d'expérience. L'outil est réalisé par le chef de projet, avec la collaboration du service des ressources humaines. La méthodologie est présentée en amont aux membres de l'équipe projet.

À éviter :

- Ne pas associer l'équipe projet à la démarche d'évaluation.
- Ne pas organiser de rencontre d'évaluation avec les personnes intéressées.
- Ne pas assurer le suivi de l'évaluation.

Astuce :

Associer le service de ressources humaines en amont et en aval du pro-cessus d'évaluation, de façon à répondre également aux attentes des équipiers (par exemple : satisfaire les demandes de formation).

Entreprise MDPSA Chef de projet : François BRECHINT Échelle de notation : ++ Très satisfaisant + Satisfaisant – Peu satisfaisant — Insatisfaisant	Fiche d'évaluation de l'équipe projet Projet AN2321 – Réalisation turbine gaz AM32 Client : Métatronic				Nom : BRENUYS Prénom : Marcel Titre de l'employé : Ajusteur Date de l'évaluation : 15/10/2014
Notation					
	++	+	–	—	Observations
Accomplissement des tâches					
Accomplit toutes les tâches du projet reliées à ses fonctions	x				
Maîtrise les informations et les outils nécessaires à ses fonctions	x				
Fait preuve de rigueur et assure la qualité de ses réalisations	x				
Sait anticiper et résoudre les problèmes inhérents à sa mission	x				
Se fixe des priorités dans le travail à accomplir	x				
Établit un échéancier en fonction des besoins et des contraintes	x				
Respecte l'échéancier défini	x				
Identifie ses besoins de perfectionnement		x			
Appréciation générale sur l'accomplissement des tâches	x				Hormis le retard pris dans le façonnage de la pièce AR700, sans incidence notoire sur la suite du projet, les tâches ont été très bien réalisées
Évaluation des rapports avec l'équipe projet					
Contribue activement à l'efficacité de l'équipe			x		
Cherche à partager ses connaissances			x		
Sollicite l'aide et la collaboration de l'équipe			x		
Communique sur les difficultés rencontrées		x			
Informe ses collègues sur l'évolution des tâches				x	
Appréciation générale dans ses rapports avec l'équipe projet			x		M. BRENUYS reconnaît lui-même qu'il a des difficultés à travailler en équipe
Savoir-être					
Établit et maintient des rapports harmonieux au sein de l'équipe projet			x		

Contribue activement au maintien et au développement des bonnes relations			x					
Perçoit et réagit aux besoins des autres			x					
Entrepren de lui-même des démarches de résolution de conflit			x					
Est honnête et direct dans ses relations avec autrui	x							
Appréciation générale sur le savoir-être					Foncièrement honnête, mais a du mal à s'ouvrir vers les autres. Un trait de caractère plus que de la mauvaise volonté			
Forces de l'employé			Aspects à améliorer					
Maîtrise complète de l'appareil de production Disponibilité, présence (jamais absent)			Rapports aux autres (tempérament renfermé dû à une grande timidité) Communication envers ses collègues					
Engagements pris dans le cadre du processus d'amélioration continue :								
Décide de faire un effort relationnel.								
Remarques complémentaires de l'employé			Remarques complémentaires du chef de projet					
Reconnaît qu'à deux ans de la retraite, « on ne va pas vraiment le changer »			Comportement individualiste sans perturber pour autant l'équipe projet, particulièrement soudée et qui a l'habitude de travailler avec M. BRENUYS. J'ai émis le souhait que M. BRENUYS fasse partager son expérience en tutorant un apprenti que l'entreprise MDPSA souhaite recruter en septembre 2015. Il souhaite y réfléchir.					
Suites à donner à l'évaluation :								
Encourager M. BRENUYS à faire des efforts relationnels. L'encourager à participer aux animations collectives organisées par le CE de l'entreprise. Valoriser le savoir-faire de M. BRENUYS								
Validation employé : Marcel BRENUYS				Date : 15/10/2014 Signature				
Validation chef de projet : François BRECHINT				Date : 15/10/2014 Signature				
Enregistrement – Service des ressources humaines Mme Solange MARQUIER				Date : 17/10/2014 Signature				

V – Enquête de satisfaction

Dans un souci constant de recherche de progrès, l'enquête de satisfaction s'avère être un outil très utile. Réalisé après le bilan de l'opération, cet outil présenté au client en fin de projet permet d'évaluer la satisfaction du client au terme d'une prestation, d'améliorer les compétences de l'entreprise en luttant contre d'éventuels dysfonctionnements et de rendre compte de l'intérêt que porte l'entreprise à la satisfaction du client. Il s'agit d'un véritable outil d'évaluation des compétences de l'entreprise portée par le jugement du client dans le cadre d'une prestation réalisée. En outre, c'est également un outil de communication externe qui entretient et valorise le canal prestataire client.

Dans sa forme pratique, l'enquête de satisfaction se présente sous la forme d'un tableau où une dizaine de questions sont mentionnées. Ces questions sont courtes et facilement compréhensibles. L'objectif est de donner envie au client de répondre au questionnaire. Bien entendu, il vous appartiendra de relancer le client s'il n'a pas souhaité répondre audit questionnaire. Chaque réponse est codifiée dans l'objectif de réaliser un traitement statistique permettant de juger de l'efficacité des prestations réalisées. En reprenant la codification rapportée à un tableur (par exemple, MS Excel).

Dans le cas d'une enquête de satisfaction globale, il est important d'adapter le questionnaire à ses destinataires. Par exemple, lors d'un ciblage de secrétaires, les parties de l'enquête concernant la production doivent clairement leur apparaître comme optionnelles.

Exemple :

L'exemple présenté ci-après concerne une entreprise cherchant à évaluer la satisfaction de son client après l'installation d'une machine-outil.

Enquête de satisfaction		Date d'envoi	Date de retour		
Société : Mac THERMIQ Affaire n° : 727-FB Vos références : PR1F05		5 mai 2014	27 mai 2014		
Êtes-vous satisfait ? Note la plus basse 0 et la plus haute 3					
Cochez la case correspondante	S	0	1	2	3
De la qualité de notre prestation	S1			x	
De la compétence et du savoir-faire de notre personnel	S2				x
De la disponibilité et de l'organisation commerciale	S3				x
De la disponibilité et de l'organisation production	S4			x	
Des délais de réalisation pour l'ensemble de la prestation	S5				x
Des procédés industriels mis en œuvre au courant de l'affaire	S6				x
De notre capacité d'intégrer les modifications	S7			x	
De nos propositions de variantes et conseils techniques	S8				x
De notre comportement sécurité et du respect de vos standards internes	S9				x
De la finition du chantier (propreté, fin de travaux, remise de la prestation...)	S10	x			
Informations complémentaires ou suggestions que vous souhaitez nous communiquer pour améliorer notre prestation : Relativement satisfait de votre prestation d'ensemble, je déplore toutefois le manque de suivi du sous-traitant chargé d'assurer le nettoyage du chantier. Un dépôt d'immondices n'a pas été évacué. De fait, vous comprendrez que l'on vous facture l'intervention d'une société de nettoyage. Dans l'attente d'une prochaine collaboration, meilleures salutations 					
Nom du rédacteur : Ferdinand BERTRAND		Date : 12 mai 2014	Cachet de l'entreprise : MAC THERMIQ		
Valeur de la notation :		Questionnaire à retourner à :			
0	Totalement insatisfait – Notre société ne répond pas du tout à ce critère et doit absolument l'améliorer pour rester fournisseur.	Entreprise SODECA Mme Françoise DORMAND Service Qualité ZI Bois Vivant 16 allée des aliziers 57000 METZ			
1	Insatisfaisant – Des points importants sont à améliorer.				
2	Satisfaisant avec réserve – Il reste des points à améliorer.				
3	Totalement satisfait – Rien à améliorer sur ce critère.				

En pratique :

À éviter :

Il ne faut pas :

- Formuler des questions trop longues et trop nombreuses qui risqueraient de décourager le client.
- Utiliser un discours trop technique ou complexe qui lasserait vite le client.
- Ne pas donner suite aux remarques du client. Cela paraît logique, mais il arrive que certaines entreprises n'utilisent ces enquêtes de satisfaction que pour s'affranchir d'une communication client faussement intéressée sans réelle volonté de changement.
- Oublier de faire une synthèse de l'ensemble des questionnaires retournés.

Principes :

- Pour rédiger le questionnaire d'enquête de satisfaction, il est conseillé de faire preuve d'empathie et de se mettre à la place du client. Bien entendu, ce type de questionnaire porte sur les compétences de son entreprise et sur la nature du produit, mais il est important de savoir ce que le client peut attendre de votre prestation en priorité (rapidité ? sécurité ? réactivité ? adaptation ?...).
- L'enquête de satisfaction doit être considérée comme un outil de partage. Partage d'information et de communication. Pour que le progrès ait lieu, que l'amélioration prenne forme et que le changement soit institué et compris, il est primordial que les résultats des enquêtes soient diffusés périodiquement (journal interne, note de service...).
- Une lettre d'explication doit toujours accompagner le questionnaire.

Autant que possible :

- Posez des questions ne nécessitant qu'une seule réponse.
- Limitez les questions ouvertes car elles sont difficilement exploitables.
- Aérez le questionnaire pour donner envie de le lire.
- Regroupez les thèmes.

Astuces :

- Utilisez une codification permettant un traitement statistique de l'information. Ces statistiques mettront en évidence des dysfonctionnements et pourront être utilisées en termes de communication interne et externe.
- N'hésitez pas à relancer le client en cas de non-réponse. Cela montre que l'on s'intéresse à lui et permet de créer une base d'information complète.
- Testez votre questionnaire auprès d'un échantillon d'utilisateurs types pour valider sa bonne compréhension et la pertinence des questions posées.
- Proposez la même échelle de valeur sur un même questionnaire.
- Précisez la signification de l'échelle de notation.

L'essentiel :

- Adressez l'enquête au client à la fin de la mission.
- Préférez les formulations courtes et compréhensibles.
- Limitez le nombre de questions.
- N'hésitez pas à relancer le client en cas de non-réponse.
- Utilisez une codification permettant un traitement statistique des résultats.
- Communiquez périodiquement en interne sur les résultats des enquêtes.
- Testez le questionnaire auprès d'utilisateurs représentatifs.
- Adaptez le questionnaire aux destinataires

OUTILS DE COMMUNICATION

I – Rapports

Rendre compte d'une situation, de prises de décision ou encore de l'avancement d'un projet se fera à travers un rapport. Nous allons ici en distinguer deux : le rapport d'avancement et le rapport de réunion exceptionnelle. Grâce à ces outils, le rédacteur formalise un état des choses soit pour informer, soit pour acter de faits.

1. Le rapport de réunion d'avancement

Dans la gestion de projet, il est primordial de juger l'état d'avancement des projets. Le rapport de réunion d'avancement est l'outil qui formalise les événements du projet. Élaboré dans le cadre d'une réunion d'avancement, le rapport rend compte des différents éléments qui jalonnent le projet. Il s'agit avant tout d'un outil de communication. Souvent négligé ou mal utilisé, le rapport de réunion d'avancement fait figure de garde-fou, là où les paroles s'en vont et les écrits restent.

Tout en gérant efficacement le projet, cet outil permet de jouer les interfaces entre intervenants et de tenir informés la direction et tous les corps de métier associés de l'état d'avancement du projet. Sur un plan pratique, l'outil doit être considéré comme évolutif. Il s'agit de compiler différentes phases et de renseigner leur état d'avancement. Ces différentes phases restent ouvertes et inscrites jusqu'à leur clôture définitive lors de la réception finale.

L'outil se décline sous la forme d'un tableau où sont renseignées 4 variables :

- Le point agenda. Cette colonne permet de donner un numéro à chaque phase et sous-phase, ainsi que la date à laquelle le point a été inscrit la première fois dans le rapport.
- Le sujet/état/actions. Cette colonne liste les phases et sous-phases, ainsi que les différents points abordés.
- Le responsable. Cette colonne indique le nom de la personne qui est responsable du point.
- L'échéance. Cette colonne indique la date à laquelle le point doit être terminé.

Au début du projet, toutes les phases du projet sont inscrites. Cela permet de ne pas aborder tous les points ou que très brièvement. Lorsqu'un point est clos, il est supprimé du rapport pour ne pas trop l'alourdir. Lorsqu'un nouveau point est apporté, il est indiqué que ce point est abordé pour la première fois.

Exemple :

Après avoir répondu à l'appel d'offres émis par la cellule informatique de l'Éducation nationale, l'entreprise s'apprête à installer les équipements. François BRECHINT, chef de projet, réunit son équipe le lundi 27 juillet au matin pour faire sa réunion d'état d'avancement hebdomadaire sur les différents projets de son unité informatique.

Rapport de réunion d'avancement

Titre : Fourniture et installation de parcs informatiques – Projet : 89Edu280

Date : 27 juillet 2014 Lieu : SYMANTIC

Participants : TH-RS-EL-MQ-FB (5)

Excusé(s) : GH

Rédacteur : FB

Prochaine réunion : 3 août 2014

Points agenda	Sujet/État/Actions	Responsable	Échéance
16 janvier 2014	Remise de l'offre	FB	15 février 2014
1. 10 janvier 2014 12 janvier 2014 20 janvier 2014 23 janvier 2014	ÉTUDES Analyse de l'offre Préparation de l'offre Chiffrage – Validation financière Remise de l'offre	EL FB MQ FB	
2. Janvier 2014	DOCUMENTATION Cahier des charges Charte informatique de l'Éducation nationale	EL EL	
3. Janvier 2014 Février 2014 Mars 2014 Mars 2014 Avril 2014 Avril 2014 Avril 2014 Mai 2014	GESTION DU PROJET Contact sous-traitant câblage Réponse à l'appel d'offres Intervention sous-traitant Commande 300 ordinateurs PC, formule scolaire Réception du chantier sous-traitant Livraison et installation matériel Réception Formation	TH FB TH RS TH RS FB RS	Janvier 2014 Février 2014 Mars 2014 Mars 2014 Avril 2014 Avril 2014 Avril 2014 Mai 2014

Points agenda	Sujet/État/Actions	Responsable	Échéance
4.	Suivi continu Intervention de l'entreprise sous-traitante	TH	
5.	Divers Assurer la maintenance du parc Garantir le volet formation	RS RS	
6.	Planning général Travaux de câblage Installation des parcs informatiques Formation Maintenance	TH RS RS RS	
7.	Questions techniques générales		
8.	Légal Fournir les normes scolaires en vigueur		
9.	Budget		

2. Le rapport de réunion exceptionnelle

Dans la vie d'un projet, des difficultés peuvent apparaître ou des points nécessiter des remaniements. Par conséquent, pour apporter des solutions, il est nécessaire d'inviter les différents protagonistes du projet et les services concernés dans le cadre d'une réunion extraordinaire qui sera formalisée par un rapport unique, précieusement archivé. Cet outil permet de formaliser ce qui a été dit entre deux interlocuteurs en indiquant précisément les marches à suivre pour chacun. Il permet aussi de valider les informations données lors d'une réunion, de consolider et rendre plus effectifs des points discutés, ainsi que d'éviter les erreurs d'interprétation et de conserver un écrit de ce qui a été dit. Des annexes peuvent compléter le rapport.

À chaque nouvelle réunion, un nouveau rapport est rédigé, idéalement pendant la réunion, puis validé directement à l'issue de celle-ci par les parties concernées par le projet. Un duplicata sera remis aux autres parties.

Présenté sous forme de tableau, l'outil intègre six variables :

- Dates : doivent figurer la date de la réunion ainsi que l'éventuelle date de la prochaine réunion
- Titre : le titre du projet ou/et de la réunion doit être clairement mentionné et compréhensible par tous, y compris par un non-participant.
- Participants et diffusion : les initiales ou les noms des personnes présentes en partie ou totalité à cette réunion seront mentionnés, mais aussi les destinataires, ainsi que les responsables hiérarchiques souvent absents mais néanmoins concernés par le projet.
- Tâches : un projet ou une réunion est divisé en tâches. Cette colonne permet donc, d'un simple coup d'œil, de connaître la tâche dont la description est donnée dans la colonne suivante.
- Actions : dans cette colonne, est décrite en détail la tâche dont il est question. Il est aussi possible d'y mettre des graphiques et dessins.
- Qui et quand : sont indiquées la personne qui a la responsabilité du point cité, ainsi que l'échéance.

Exemple :

L'exemple cité concerne le dépassement d'un délai qui entraîne une modification du planning et une nouvelle distribution des tâches.

RAPPORT N° EXTRAORDINAIRE	3	TITRE PROJET :	RÉDUCTION DES COÛTS : ÉNERGIES ET EAU	MOIS :	MARS
		Réf. PROJET :	F-3-MD	DATE :	19/03/14
CHEF DE PROJET :	CLIENT / UTILISATEUR FINAL : AIR TECH				
François BRECHINT	OFFRE INITIALE				
	AVENANT / MODIFICATION				

Tâche	Action	Qui	Quand
Air chaud	Contacter le fabricant du sècheur pour la solution de la réutilisation de l'air chaud extrait ou par apport d'air neuf. Où (ré)injecter l'air physiquement dans le sècheur? Faire compte rendu à Airtech.	YAD	S6/14
Mesures	Offre pour prises de mesures par Airtech.	AT	S6/14
Mesures	Commande	YAD	S7/14 (début)
Mesures	Prises de mesures	AT	S7/14 (fin)
Mesures	Résultats expliqués clairement	AT	W8/14

Tâche	Action	Qui	Quand
Eau	Après prises de mesures et rapport fournisseur sècheur, étude sur la récupération d'eau (quantités par jour...)	AT	S10/14
Air chaud	Après prises de mesures et rapport fournisseur sècheur, étude sur la récupération de calories (quantités par jour...)	AT	S10/14
Eau/mesures	Extraction des GV L1 : Y a-t-il quelque chose à récupérer? À voir avec prises de mesures.	AT	S7/14
Documents	Envoi des documents flow-sheets sous format AutoCad (dwg) ¹ .	AT	S6/14
Validation	Entreprises	Émargement	
	Pour Airtech : Arthémis THISAUR		
	Pour STRASS France: Yannick DUBOIS		

En pratique :

À éviter :

- Donner un caractère exceptionnel aux réunions d'avancement et aux rapports qui en découlent par le manque de fréquence.
- Organiser différentes réunions en associant les acteurs du projet selon leur domaine de compétences.

Principe :

Les rapports de réunions d'avancement :

- Partir du principe que la réunion d'avancement est une réunion régulière lors de laquelle sont traités différents projets. Dans ce cadre, le rapport d'avancement du projet concerné doit être clair et concis.
- Qui dit avancement dit évolution. Aussi, il est important de donner les faits marquants liés à l'évolution du projet en mentionnant les solutions qui ont été apportées durant le projet
- Faire participer les différents acteurs du groupe projet à ces réunions régulières afin de les tenir informés de l'évolution du projet et, le cas échéant, de trouver des solutions en commun.

Les rapports de réunion extraordinaire :

- Utiliser le rapport de réunion extraordinaire aussi souvent que possible, que ce soit pour régler un problème ou tout simplement pour discuter d'un projet futur par exemple.
- Cet outil n'est pas conçu pour des réunions répétitives sous le même thème.
- Rédiger et valider le rapport idéalement directement lors de la réunion dite extraordinaire.

Astuce :

- Garder, sur le rapport d'avancement, les différentes phases renseignées qui ont marqué le projet (problème rencontré, solution apportée, élément nouveau...).
- Proposer une codification permettant un bon archivage du rapport de réunion extraordinaire.

Points essentiels à retenir :

Usage :

- La réunion projet est une réunion périodique et régulière.
- Le rapport de réunion extraordinaire n'est pas réutilisable.
- Le rapport permet de formaliser ce qui a été dit.

Conception :

Particularités concernant le rapport d'avancement :

- Les différentes phases restent ouvertes et inscrites jusqu'à leur clôture définitive lors de la réception finale.
- Au début du projet, toutes les phases sont référencées.
- Chaque point est étudié avec l'ensemble des intervenants.

Spécificité concernant le rapport de réunion extraordinaire :

- Il est rédigé au fur et à mesure de l'avancement de la réunion.

II – Rapport continu d'information

La réussite d'un projet passe par une communication diffuse, régulière et organisée, particulièrement avec le client qui est le commanditaire. Dans ce cadre, il est utile de dresser un rapport continu d'information qui renseignera le client sur l'état d'avancement du projet. Rédigé par le chef de projet, ce rapport d'information continu vient en complément des réunions d'information ou de chantier. Il est adressé à la fin de la semaine et récapitule les principales

actions qui ont été menées durant la semaine écoulée, les décisions importantes qui ont été prises et les difficultés rencontrées.

1. Objectif

L'objectif de cet outil de communication périodique est de donner au client une plus grande visibilité sur le projet, notamment pour le rassurer et maintenir un climat de confiance entre les deux parties. Si le projet ne présente pas de difficultés particulières, le client est généralement ravi. Le cas échéant, il est satisfait d'apprendre que des solutions ont été apportées pour contourner les difficultés rencontrées. Ce document permet aussi de valoriser l'action menée par l'équipe projet. En revanche, en cas de problème grave, le chef de projet se doit d'alerter sa hiérarchie et décide avec elle d'avertir le client selon une forme plus appropriée : entretien téléphonique, réunion sur le site, réunion extraordinaire du comité pilotage. À ce moment-là, le rapport continu d'information cesse d'être le fil conducteur de la communication entre le client et le prestataire, pour que s'instaure une communication plus directe entre les deux parties.

Afin de gagner du temps, le chef de projet utilise des phrases simples pour rédiger cet outil en ne retenant que les faits importants. Il ne s'agit surtout pas pour le chef de projet de présenter un rapport détaillé qui s'avérerait contre-productif. Ce document tient donc sur une seule page et est adressé au client par courriel à la fin de la semaine. Concernant la périodicité de transmission du rapport continu d'information, elle est généralement hebdomadaire. Bien entendu, si la durée de réalisation de projet ne dépasse pas une semaine, le rapport continu d'information continu n'a pas lieu d'exister.

2. Principe

L'outil est découpé en 4 parties. Il doit tout d'abord synthétiser les actions importantes menées durant la semaine écoulée.

A. État d'avancement

Dans la première partie de l'outil, il s'agit d'indiquer l'état d'avancement du projet en précisant à quelle phase du projet on se situe. Pour une meilleure compréhension, le découpage des phases est clairement indiqué ; en général, il reprend les termes du cahier des charges. Cette première partie de l'outil récapitule surtout l'action qui a été menée durant la semaine écoulée.

Exemple :

Situation du projet				
Phase	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4
Avancement	Réalisée	Réalisée	En cours	Reste à Faire
Actions menées durant la semaine 38 Travaux paysagers : plantations, pose des pavés...				

B. Difficultés rencontrées

La deuxième partie de l'outil renseigne sur les difficultés rencontrées et les solutions envisagées. Si aucune difficulté n'est apparue, la mention RAS est indiquée et on peut passer directement à la quatrième partie qui précise l'action à mener la semaine suivante.

Exemple :

Difficulté(s) rencontrée(s)	☒ Oui ☐ Non	Précision(s) : rupture d'une canalisation d'eau lors des travaux de terrassement inhérente à l'installation du chemin piétonnier formé de pavés.
Solution(s) envisagée(s)	Après discussion, le paysagiste s'est engagé à financer la réparation de la canalisation défectueuse via son assurance. D'ailleurs l'expert s'est déplacé pour constater l'étendue des travaux de réparation et a donné son accord.	

Si des difficultés apparaissent, il s'agit d'indiquer leur degré de risque pour la poursuite du projet. Le degré du risque impactant le projet est évalué par le chef de projet et son équipe qui ne manquent alors pas de proposer des solutions pour contrer les difficultés.

MSDP-SA	RAPPORT CONTINU D'INFORMATION			Client : MERX-SA
Chef de projet : M. François BRECHINT				Référent client : Mme Claire CHANTAI
Période concernée :	Semaine 20 - 17 au 21 mai 2014			Réf : 12-RIC-MER.05.14
Situation du projet				
Phase	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4
Avancement	Réalisée	En cours	Reste à faire	Reste à faire
Actions menées durant la semaine 20	Poursuite de la transformation des blocs de titane brut en fils tressés. Mercredi, la commande de titane n'a pas été réceptionnée. Après contact client, il s'avère qu'une grève reconductible diligentée par le syndicat des transporteurs routiers d'Athènes 'Force Sud' bloque le pays. Notre stock de titane limité à trois semaines impose la vigilance. La production n'a pour le moment pas été impactée par cette perturbation.			
Difficulté(s) rencontrée(s)	☒ Oui ☐ Non	Précision(s) : Le risque est à prendre au sérieux. Ce syndicat est réputé pour être très virulent et menace de bloquer le pays sur une période longue, comme en 1998. Le pays avait été bloqué plus d'un mois !!!		
Solution(s) envisagée(s) :	Contacter les entreprises Tao-lee à Shanghai et Kingley à Prétoria pour étudier l'opportunité de s'approvisionner chez eux.			
Risque(s) identifié(s)	☒ Oui ☐ Non	Niveau du risque ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3	Procédure à suivre : Organiser une réunion du comité de pilotage.	
Semaine prochaine	Actions à mener :			
Semaine 21 24 AU 28 MAI 2014	Poursuite de la production. Engager les démarches pour faire appel à un autre sous-traitant. La situation doit être clarifiée au courant de cette semaine.			
Transmission	Client	Directeur de Projet	Chef de Projet	Secrétaire
(Courriel)	C.CH - MERX	D.GR-MDP-SA	F.BO-MDP-SA	S.MA-MDP-SA

C. Degré de risque pour la poursuite du projet

Le risque est identifié par le chef de projet qui n'hésitera pas à soumettre son appréciation à l'équipe projet afin d'obtenir une position collégiale et objective. Bien entendu, cette troisième partie renseigne directement la quatrième qui vise à définir l'action à mener la semaine suivante.

Risque(s) identifié(s)	☒ Oui ☐ Non	Risque(s) identifié(s) : 0	Procédure à suivre : assurer le suivi des travaux de réparation
-----------------------------------	---	-------------------------------	---

D. Actions à mener la semaine suivante

La quatrième partie du document précise les actions à mener la semaine suivante.

Exemple :

Semaine prochaine Semaine 39	Actions à mener : Procéder au remplacement de la canalisation avec le matériel indiqué Assurer le suivi de cette opération Reprise et fin du chantier paysager Parking 1 : pause de l'enrobé
---	---

En pratique :

À retenir :

Le rapport d'information continu est un outil de communication périodique destiné au client, maître d'ouvrage. Son but est de donner une information précise à un instant défini. Il récapitule l'action menée et présente celle à venir.

À éviter :

- Gaspiller un temps précieux.
- Formuler des phrases longues et peu compréhensibles.
- Transmettre le rapport à des périodicités irrégulières.

Avantages :

- Outil qui valorise l'action menée par le maître d'œuvre.
- Outil qui rassure le client et lui permet de réagir rapidement en cas de difficulté.

III – Outils de résolution de conflits

De nombreux chefs de projet ne sont pas à l'aise dans la gestion des conflits. Normal, quand on sait que le conflit perturbe le projet et risque d'entraîner des conséquences plus ou moins graves dans l'entreprise : retard dans les travaux, échec, perte de productivité et de rentabilité, image de marque...

Les conflits sont inévitables dans les projets, c'est pourquoi il s'agit d'en identifier rapidement la source de façon à corriger le problème. Plus tôt ils sont identifiés et réglés, plus vite le projet est mené vers la voie du succès. Certains conflits prennent naissance dans l'entreprise qui n'a pas réussi à s'adapter au changement. Des désaccords naissent du fait de choix techniques ou organisationnels qui ne sont pas adaptés aux réalités d'aujourd'hui. Ce n'est pas la compétence du chef de projet à gérer ces conflits qui est mise en cause, mais bien l'organisation de l'entreprise qui est à revoir.

D'autres conflits concernent les rôles de chacun dans le processus projet. Les perceptions des individus et leurs attentes différentes compliquent le rôle du chef de projet qui doit s'affirmer davantage. Ces conflits naissent du flou engendré par la désignation des rôles et des responsabilités de chacun. Il appartient à la direction projet de les identifier en amont avant d'engager le projet. Des conflits entre personnes au sein même d'une équipe projet peuvent trouver leur origine dans des divergences d'opinions. Il est alors possible de trouver des solutions

précises en insistant sur les faits. Les intérêts propres doivent s'effacer devant l'intérêt général : la réussite du projet en dépend. Dans une équipe, il appartient au chef de projet de trouver les mesures nécessaires, considérées comme les plus justes et les plus acceptables, pour arranger la situation. Des conflits bien gérés permettront à l'équipe d'améliorer son organisation de travail. L'organisation verra même sa productivité s'améliorer.

Dans le cadre d'une gestion de conflit, il est indispensable pour le chef de projet de rappeler à ses interlocuteurs la situation professionnelle de l'exercice de leur fonction. L'entreprise a des valeurs auxquelles le projet est rattaché. Les membres de l'équipe doivent avoir un comportement responsable et adulte. Dès la première confrontation, il s'agira de demander une amélioration de la situation : les intérêts de l'entreprise prévalent. En outre, chercher à régler un conflit dans une équipe projet revient avant tout à établir une stratégie de gestion de conflit visant à se rapprocher d'une solution gagnant-gagnant où tous les partis sont satisfaits.

L'arbitrage hiérarchique, par la qualité de chef de projet, ou le retrait d'une des parties ne règlent pas le conflit et risquent de le revoir surgir avec plus de gravité. Il s'agit pour le chef de projet de se diriger vers une confrontation coopérative en rappelant les valeurs de l'entreprise. Quant à la stratégie de l'apaisement, si elle peut s'avérer immédiatement efficace, elle ne règle pas le conflit en profondeur. Pour se diriger vers la solution gagnant-gagnant, il est nécessaire de se baser sur des faits observables. En premier lieu, il s'agit d'établir un climat de confiance réciproque permettant un échange favorable à la description des faits générant le conflit.

Le deuxième point de règlement du conflit concernera la qualité d'écoute du chef de projet qui cherchera à trouver des solutions au conflit. Le chef de projet cherchera à s'entretenir avec la ou les personnes concernées, dans leur environnement de travail (bureau, atelier), non pour écouter ses interlocuteurs, mais pour les entendre. Autrement dit, il s'agit de bien comprendre le message qui est transmis.

Si différentes personnes sont touchées par ce conflit, la confrontation entre les différents protagonistes sera envisagée dans un environnement neutre (salle de réunion, bureau du chef de projet...). Bien entendu, la hiérarchie sera informée en fonction de la gravité du conflit et des risques qui pèsent sur le projet. Le troisième principe concerne l'art de traduire en verbal ce qui ne l'est pas : la posture, la voix chancelante, le désaccord non exprimé, l'impression de lassitude... Le chef de projet doit pouvoir traduire en faits ce qui n'est pas dit, par l'analyse du comportement de son interlocuteur.

Enfin, le quatrième élément à prendre en compte dans la gestion de conflit concerne la validation des faits. Après avoir analysé tous les éléments de la situation de conflit, il appartient au chef de projet de les valider pour décider de l'issue du conflit.

L'essentiel :

Outil dédié aux ressources humaines, la fiche de résolution de conflit permet au chef de projet d'essayer de résoudre une crise sur la base de la discussion et de l'écoute, en réunissant les protagonistes concernés. Il s'agira de privilégier une solution gagnant-gagnant pour la sortie de crise, en apportant des éléments de réponses convaincants.

Conseils :

- Bannir les ouï-dire.
- Exprimer le ressenti dans la situation de conflit en utilisant le « je », signe d'empathie favorable à l'instauration d'un climat de confiance.
- Ne relever dans la fiche action que les faits observables.
- Dans la mesure du possible, proposer une solution juste et acceptable pour les différentes parties.

À éviter :

- Tenter de régler le conflit par échange de mails, courrier, note de service... ou téléphone.
- Chercher à régler le conflit en présence de témoins, non concernés.
- Informer sa hiérarchie quand la situation ne le mérite pas

MDP SA TRAVAUX PUBLICS	FICHE ACTION RÉSOLUTION DE CONFLIT Projet : extension de l'hôpital Saint-Paul de Sens		Conducteur de travaux : François BRECHINT
Définition du conflit :			
Problème relationnel qui s'apparente à première vue à un conflit générationnel entre deux agents : le chef de chantier, M. BRUN, nouvellement recruté, et M. DESMOULINS, conducteur d'engin.			
Risque pour le projet/l'entreprise : mauvais climat au sein de l'équipe projet. Productivité en baisse.			
Lieu de la réunion : sur le chantier.			
Demander aux agents de décrire par les faits la situation de conflit	Ressource 1 M. BRUN	Reproche à M. DESMOULINS son manque d'implication et son caractère irascible.	
	Ressource 2 M. DESMOULINS	Nie les faits en bloc et reproche à M. BRUN son incompetence, due à sa jeune expérience.	
	Ressource 3	RAS	
Proposition d'amélioration de la situation : l'entreprise prévaut. Il leur est demandé de régler ce conflit de personne en adulte et d'oublier leurs querelles personnelles pour le bien du projet. Des sanctions seront prises si la solution ne venait pas à s'améliorer.			
Réaction à la demande d'amélioration de la situation, dans l'intérêt du projet et de l'entreprise.	M. DESMOULINS Rien à se reprocher	M. BRUN Rien à se reprocher	
Définition des éléments de blocage à une sortie du conflit gagnant-gagnant	M. DESMOULINS N'accepte pas d'être dirigé par un jeune chef de chantier	M. BRUN A du mal à se faire respecter	
Reporter les raisons des tensions après écoute	M. DESMOULINS Regrette le départ de l'ancien chef de chantier qui a fait valoir ses droits à la retraite	M. BRUN N'accepte pas d'être déjugé devant ses collègues	
Demander aux employés de faire des suggestions à suivre pour atteindre la solution la plus favorable	M. DESMOULINS souhaite avoir plus d'autonomie, qu'on lui remette le programme de la journée et qu'on le laisse travailler	M. BRUN Souhaite plus de respect à l'égard de son rang hiérarchique et a conscience qu'il a encore besoin de se former à la gestion d'équipe	
Décider ensemble des étapes à suivre pour atteindre la solution choisie	Une réunion de chantier sera proposée chaque matin avec l'ensemble de l'équipe projet où les missions de chacun, dont celles de M. DESMOULINS, seront discutées en lieu et place de la réunion hebdomadaire.		
Définition d'un calendrier de rencontres pour suivi du conflit	Courte réunion sur le chantier prévue la semaine suivante en présence du conducteur de travaux. Si la situation ne s'améliore pas, une nouvelle rencontre dans le bureau du conducteur de travaux aura lieu avant de prendre une décision finale à l'issue de ce conflit.		
Action	Envoyer M. BRUN en formation sur la gestion d'équipe pour s'aguerrir.		

REPORTING

IV– Reporting d’exploitation

Ce tableau de bord est utilisé pour faire un relevé de situation. On y trouve au moins un axe d’analyse, associé à un ou plusieurs indicateurs. Voici quelques exemples de reporting d’exploitation.

1. Relevé des coûts par ressource

Ce tableau présente, pour une période définie et pour chaque ressource d’un projet, la quantité initiale, la quantité déjà consommé et le reste disponible, données qui sont valorisées en jours/homme. Enfin, le tableau est complété avec la date de la dernière commande et son montant

Période du 01/01/2014 au 15/02/2014								
Ressources	J/H initial	Quantité commandée en J/H	J/H disponible restant	Budget initial	Budget consommé	Date d’achat	Montant d’achat	Nouveau budget disponible en euros
A. Martin	20	5,0	5	38	19,00	03/01/2014	9,5	9,50
J . François	150	39,5	71	285	75,00	17/01/2014	75	135,00
B. André	210	47,5	115	400	90,25	17/01/2014	90,25	180,50
G. Pierre	210	90,0	57	400	119,75	14/02/2014	171	109,25
R. Laurent	250	90,0	55	475	199,50	14/02/2014	171	105,50
	840	272,0	303	1598	503,50		516,75	539,75

Reporting d’exploitation : coûts par ressource

2. Relevé des ressources par projet et activité

Ce tableau détaille la répartition de l’activité des ressources par projet. On y trouve des indicateurs d’estimation initiale (durée prévue), de temps de travail réel, de ce qu’il reste à faire (disponible restant), ainsi que la valorisation de ces deux derniers indicateurs. Enfin, pour chaque ressource est donnée une synthèse des mêmes indicateurs

Ressources	Fonction	Projet	Activité	Durée prévue (J/H)	Temps de travail réel (J/H)	Disponible restant (J/H)	Durée consommée valorisée	Disponible valorisé
A. Martin	DBA	SpaceWeb	Admin	15	10,00	5,00	19,00	9,50
A. Martin	DBA	Gpec	Admin	5	0,00	5,00	0,00	9,50
A. Martin				20	10,00	10,00	19,00	19,00
J. François	ANA	SpaceWeb	Analyse	150	39,50	110,50	75,00	135,00
J. François				150	39,50	110,50	75,00	135,00
B. André	DEV	SpaceWeb	Prog	110	27,50	82,50	52,25	156,75
B. André	DEV	Gpec	Prog	100	20,00	80,00	38,00	152,00
B. André				210	47,50	162,50	90,25	258,75
G. Pierre	DEV	SpaceWeb	Prog	210	63,00	147,00	120,00	280,00
G. Pierre				210	63,00	147,00	120,00	280,00
R. Laurent	CP	Gpec	Projet	150	47,50	102,50	90,25	194,75
R. Laurent	CP	SpaceWeb	Projet	100	57,50	42,50	109,25	80,75
R. Laurent				250	105,00	145,00	199,50	275,50

Reporting d'exploitation : relevé par ressource par projet et par activité

3. Relevé des ressources par projets

Projet	Libellé	Date début	Date fin initiale	Écart réel (J/H)	Date fin prévisionnelle
Space Web	Restructuration de l'intranet de l'entreprise	01/09/2013	01/03/2014	+20	28/03/2014
GPEC	Gestion prévisionnelle des emplois et carrières	15/09/2013	01/07/2014	-37	15/05/2014

Reporting d'exploitation : échéances projets

Rappel :


- Outil destiné à faire un relevé de situation à un instant T.
- Il contient au moins un indicateur et un ou plusieurs axes d'analyse.
- C'est un outil de travail opérationnel.

V – Mesure de la performance

La performance se mesure toujours par rapport à un autre élément. Il est ainsi possible de suivre l'évolution d'un ou de plusieurs indicateurs par rapport à un axe d'analyse, qui peut être le temps ou les coûts, par exemple. Voici quelques exemples de tableaux et graphiques mesurant la performance.

1. Evolution de la consommation des ressources par projet

Ce graphique présente le cumul du nombre de jours/homme consommé par projet et par mois. Il permet d'identifier facilement les centres de coûts

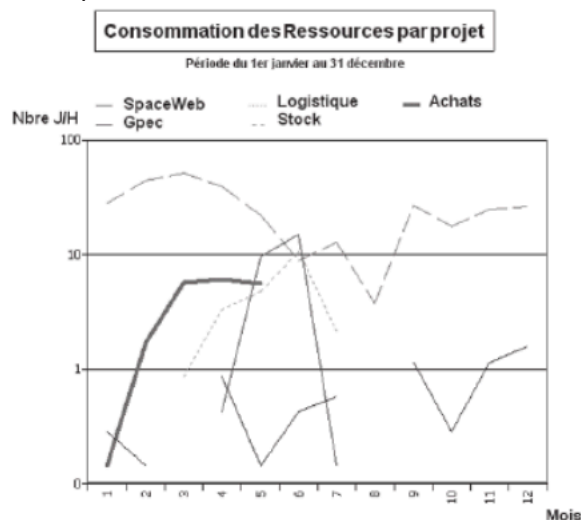

Mesure de performance : ressources par projet

2. Coûts des projets par année

Ce tableau « croisé » met en regard les coûts associés à plusieurs projets sur plusieurs années. Il permet de voir l'évolution des coûts d'un portefeuille de projets.

Coûts en K€ des projets par année

Chef de projet : R. LAURENT


Mise à jour du 31 décembre 2014

Année Projet	2008	2009	2010	Cumul projet
Achats	128,00	23,00	314,00	465,00
Gpec	3,00	21,00	2,00	26,00
Logistique	159,00	163,00	271,00	593,00
SpaceWeb	201,00	154,00	23,00	378,00
Stock	2 362,50	1 472,50	1 703,50	5 538,50
Cumul Annuel	2 853,50	1 833,50	2 313,50	7 000,50

Mesure de performance : coûts annuels par projet

3. Évolution de la marge de temps, projet par projet

Ce graphique permet de mettre en évidence les projets susceptibles de ne pas tenir dans les délais annoncés. Il est basé sur un cumul des écarts hebdomadaires.

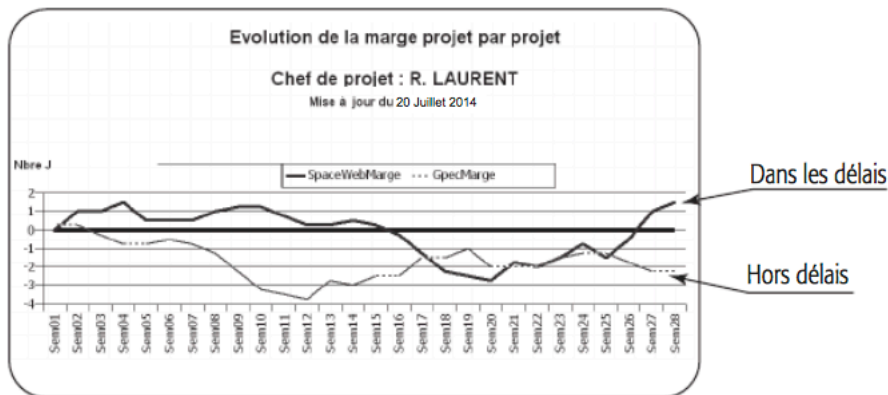

Mesure de performance : évolution de la marge projet

À noter : le tableau de bord de mesure de performance s'adapte à d'autres axes d'analyse tels que les coûts, les besoins en trésorerie, etc.

L'essentiel :

- C'est un outil d'analyse qui sert à évaluer une performance.
- Il est destiné à l'encadrement.
- Il utilise souvent la technique des tableaux croisés

VI – Pilotage

Les tableaux de bord de pilotage font état d'une évolution ou d'une tendance. Leur but : permettre d'envisager une action ou d'appuyer une décision. Voici quelques exemples.

1. Activité projet

Ce tableau présente l'évolution de l'activité en jours/homme de tous les projets sur deux exercices consécutifs, chaque projet étant scindé en sous-projets. On y trouve de multiples signaux destinés à sensibiliser le destinataire.

Sous-projets en cours

Projet	Sous-projet (Bilan des ressources 2011)	2010		2011		Taux d'évol.
		11	12	01	02	
SpaceWeb	Atelier Fonctionnel D	30,00%	1,14			
	Atelier Fonctionnel D		4,70	-0,79		
	Atelier technique				1,14	1,14
	Somme	5,14	4,70	-0,83	1,14	1,14
Achats	Coordination-agrégation	20,10%	10,20	7,71	18,57	8,14
	Service		11,25	7,71	18,57	8,14
	Somme	11,25	7,71	18,57	8,14	8,14
	Somme	11,25	7,71	18,57	8,14	8,14
Stack	Formation technique				0,57	0,57
	Somme				0,57	0,57
Logistique	Formation technique		0,40	0,71	0,71	0,71
	Somme		0,40	0,71	0,71	0,71
Gpec	Formation technique		0,40	0,71	0,71	0,71
	Somme		0,40	0,71	0,71	0,71
Total			18,71	13,21	25,00	11,80


Alerte couleur signalant l'évolution entre les 2 exercices

Libellé ou taux d'évolution associé à l'alerte

Pilotage : activité projets

2. Qualité de la formation

Ce graphique permet de mesurer l'efficacité des formations : une formation métier, par exemple, devrait pouvoir faire baisser le nombre d'appels concernant le même thème au support hotline

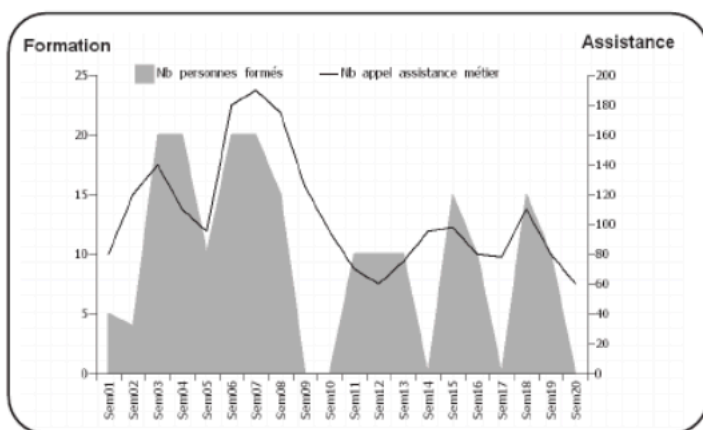

Pilotage : qualité des formations

L'essentiel :

- Cet outil met en évidence des tendances.
- Il amène toujours à une action ou à appuyer une décision.
- Il est destiné aux décideurs

En pratique :

La réalisation de tableaux de bord est un exercice à multiples facettes. Si le résultat final peut apparaître sous diverses formes (tableaux ou graphiques), il est important que le travail en amont soit préparé dans les règles de l'art. En effet, l'indice de confiance que l'on accordera à ces tableaux ou graphiques dépendra essentiellement de la qualité des données collectées. Il suffit de présenter un indicateur ambigu ou contestable pour discréditer l'ensemble des tableaux de bord. La constitution des tableaux de bord doit donc respecter au moins trois règles incontournables :

- Besoin : il doit être clairement exprimé par la maîtrise d'ouvrage, car il déterminera les sources et la structure des données.
- Qualité : l'origine et l'intégrité des données ne doivent souffrir d'aucune critique.
- Restitution : l'ergonomie et le confort de lecture doivent être adaptés au public auquel il est destiné.

L'adage « Qui peut le plus, peut le moins » n'est pas de mise ici, car la lisibilité des indicateurs réellement pertinents est essentielle. Afin de favoriser au maximum l'expression des indicateurs, leur choix et leur représentation doivent être qualifiés avec la plus grande attention afin de faciliter leur compréhension auprès des destinataires des tableaux de bord. Enfin, le choix des outils qui vont permettre de réaliser ces différents tableaux ou graphiques va dépendre du public cible, de la disponibilité des données, des conditions d'accès aux tableaux, du budget et de l'équipe en charge de leur réalisation. Deux catégories d'outils sont actuellement disponibles sur le marché, les payants et les gratuits, chacune présentant des

avantages et des inconvénients qu'il convient d'étudier avant d'arrêter son choix. Ainsi un outil gratuit nécessitera, peut-être, plus de compétences pour la réalisation de ces tableaux, a contrario la prise en main d'un outil payant par un simple utilisateur s'avérera éventuellement plus facile. Sachez que la gratuité est toute relative, car, s'il n'y a pas de coûts directs, les coûts indirects ne sont pas toujours négligeables. Aussi, faire le choix d'un outil gratuit pour un tableau de bord présentant une application critique peut s'avérer un choix risqué

VII – Bons de travaux

Les bons de travaux sont à remplir par chaque intervenant extérieur (EE) et par l'entreprise utilisatrice (EU) recevant les prestataires. Ils sont généralement demandés par l'assureur lors de toute intervention. Le formulaire analyse des risques est à lire et faire signer en même temps que les bons de travaux. Ces formulaires sont à remplir avant le début des travaux. On pourra ainsi identifier les risques liés aux travaux et donner les instructions liées :

- à la sécurité ;
- aux pratiques courantes au sein de l'entreprise ;
- aux standards internes ;
- au lieu d'intervention ;
- aux types de travaux à effectuer.

1. Registre des bons de travaux

Registre des bons de travaux				
Objectifs et domaines d'application				
Enregistrer les bons de travaux concernant les interventions des sociétés extérieures.				
Enregistrement chronologique des bons de travaux				
Mois de janvier				
N° du BdT	Date enreg.	Établi par	EE	Nature des travaux
92	14/01/14	Yad	Kimmer	Montage gravé cal2 + couronne cal1
93	14/01/14	Nro	Francis	Montage gravé cal2 + couronne cal1

Mois de février				
N° du BdT	Date enreg.	Établi par	EE	Nature des travaux
94	25/02/14	Nro	Munch	Carottage + relevé dans fosse cardes L2
Mois de mars				
N° du BdT	Date enreg.	Établi par	EE	Nature des travaux
Mois d'avril				
N° du BdT	Date enreg.	Établi par	EE	Nature des travaux

2. Prévention des risques d'interférence

Prévention des risques d'interférence	
Mesures générales	• Port obligatoire du badge d'identification sur tout le site • Interdiction de fumer dans les locaux • Le port des protections auditives est obligatoire dans le hall de production • Les temps d'ouverture des portes du bâtiment devront être minimisés (air conditionné contrôlé, perturbation aéraulique) • Port de chaussures propres pour traverser l'usine
Consignes d'urgence	• SA présent dans chaque équipe et secteur pour les soins Accident bénin : faire appeler un sauveteur secouriste du travail de MDP • Accident grave : appeler les secours par le 015
Circulation sur les lieux du travail	Incendie : alerter puis prévenir les secours par le 018 • Stationnement sur les places de parking devant l'usine (ne pas stationner devant les portails) • Vitesse limitée à 20 km/h • À l'intérieur de l'usine, respecter les zones de circulation réservées aux piétons et chariots
Chutes & heurts	• Port des chaussures de sécurité • Emploi d'une nacelle ou pose d'un échafaudage ou port du harnais pour travaux en hauteur • Baliser les zones d'intervention
Manutention	• Conduite de chariots, nacelles ou ponts roulants par personnels avec autorisation de conduite • Baliser les zones d'intervention • Les accessoires de levage devront être en bon état et conformes
Risques électriques	• Consignation (énergies électriques, mécaniques) des installations par un technicien habilité de MDP SA avant toute intervention •
Incendie	• L'outillage électroportatif doit répondre aux normes de conformités de fabrication établies par le donneur d'ordre de MDP SA Tout travail par point chaud (soudage, rivetage...) nécessite un permis

Rayonnements	Des équipements utilisant des sources ionisantes peuvent se trouver à proximité de la zone d'intervention : prendre connaissance des consignes affichées sur la machine
Déchets	Évacuation des déchets vers les filières adaptées
Hygiène Risque bactériologique	- Respecter l'état et la propreté des installations sanitaires, vestiaires mis à disposition - Veillez à ne pas contaminer l'environnement de production par des salissures : pensez à laver vos mains, à nettoyer ou à dégraisser le secteur d'intervention
Polluants	- Éviter la création de poussière ou copeaux - Les opérations générant des projections de particules (meulage, soudage) devront être exécutées hors atelier de production, nettoyer les pièces pour ne pas ramener de polluants - Capter les polluants à leur création afin d'empêcher la propagation - Bâcher et protéger au plus prêt de la création du polluant - Couvrir et protéger les machines ou matériels à proximité de la zone d'intervention - Nettoyer au fur et à mesure la zone d'intervention ainsi que le matériel utilisé - Récupérer et évacuer tous les déchets
Chute d'objets	contenir la chute d'un objet. L'intervenant installera tout dispositif permettant d'empêcher ou de
Acheminement des matières sur le lieu d'intervention	Le matériel transporté à travers l'usine (magasin et atelier) doit être propre, sans copeaux ou poussières au risque de disperser ces corps et de contaminer le sol et nos produits finis et matières premières.

Date :	Date :
Demandeur des travaux : Visa :	Ces consignes et mesures de prévention sont à transmettre au personnel de l'EE par le responsable sur le site.
Responsable MDP SA du secteur Visa :	Responsable sur le site de l'EE : Visa :

3. Bon de travail

MDP SA		
Bon de travail n° 96		
À établir pour chaque entreprise extérieure (ou sous-traitant)		
Entreprise utilisatrice	Entreprise extérieure	
MDP SA Tél. : 09 89 79 65 59 Rue Henri Seiller – ZI Fax: 09 89 79 65 50 75360 Paris Demandeur des travaux: S. Dumont Responsable fabrication: F. Brillard	Raison sociale : Martin SA Adresse : 76116 Rouen Tél. : 02 35 07 94 70 Fax : 02 35 07 94 71 Responsable sur le site : M. Dangel	
Opération		
Description, nature des travaux: Projet REENG10 Lot charpente : renforcement plancher 6.30 Lieu : Atelier ouvraison – niv, 00	Dates d'intervention prévues : Horaires prévus : Jours ouvrables 8 h 00 – 18 h 00	Effectif prévu : 5 personnes Week-end/Fériés non
Visite préalable		
Documents remis/explicés Plan renseigné de l'établissement oui non Consignes d'urgence (accident, incendie) oui non Permis de feu oui non Fiches de consignation oui non Autres consignes :	Bilan de la visite commune Date de la visite préalable : Éléments du plan repérés oui non – zones de travail à risques... – voies de circulation (piétons, véhicules) – emplacements destinés au stationnement, au stockage, locaux sanitaires... Signalisation et consignes de sécurité repérées oui non —	
Analyse et prévention des risques d'interférence		
Nature des risques (phases d'activité dangereuses: EU – EE, isolement, matériels...)	Mesures de prévention	
	UE	EE
Rien de spécifique en dehors de la liste ci-jointe (prévention des risques d'interférence)		
Date : 25/08/14 Demandeur des travaux: S. Dumont Visa Responsable fabrication: F. Brillard Visa	Date : 25/08/14 <i>Les instructions et mesures arrêtées lors de la visite préalable sont à transmettre au personnel de l'EE par le responsable sur le site.</i> Responsable sur le site de l'EE: Dangel Visa	

4. Autorisation de démarrage des travaux

Dates d'intervention prévues				
Dates d'intervention : du 25 au 29/08/14		Visas		
Nom des intervenants EE : Philippe Marlin Philippe Nordfors Éric Dangela Jean Maeyer Frank Demougine François Gérard		Demandeur des travaux	Responsable fabrication	Responsable sur le site
Nouvelles dates d'intervention				
Nouvelles dates	Noms des intervenants EE	Visas		
		Demandeur des travaux	Responsable fabrication	Responsable sur le site
31/08/14 – 01/09/14	Éric Dangela Jean Maeyer			
Modification des effectifs/Nouveaux arrivants				
Les instructions et mesures arrêtées lors de la visite préalable sont à transmettre aux nouveaux arrivants par le responsable sur le site.				
Date	Modification des effectifs		Visas	
			Demandeur des travaux	Responsable sur le site
Prêt de matériel par l'entreprise utilisatrice				
Date	Type de matériel		Visas	
			Demandeur des travaux	Responsable sur le site
Suivi des travaux				
Si nécessaire, mettre à jour la rubrique « Analyse et prévention des risques d'interférence »				
Date	Observation		Nom – Fonction – MDP SA/EE	
28/08/14	Matériel inflammable (bois) près de la zone de soudure. Mettre en place bâche ignifugée + extincteur + surveillance pendant la durée des travaux point chaud		Y. Marlin/E. Dangela	

Validation de la fin des travaux			
Les travaux prévus sont exécutés	oui	non	
Les machines sont déconsignées	oui	non	
Le chantier est propre et rangé	oui	non	
Dates	Visas		
	Demandeur des travaux	Responsable fabrication	Responsable sur le site
1 ^{er} septembre 2014			

5. Analyse des risques spécifiques

MDP SA			
Analyse des risques spécifiques			Annexe au BT n° 96
Analyse et prévention des risques d'interférence			
Nature des risques	Mesures de prévention	MDP SA	EE
Mesures générales	- Interdiction de fumer dans les locaux - Le port des protections auditives est conseillé - Port du badge dans l'usine - Respect de l'environnement, particulièrement des machines - Respect des protections et balisages - Les portes du bâtiment resteront ouvertes un minimum de temps		✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Hygiène	- Nettoyage des lieux au fur et à mesure pour empêcher la dissémination de copeaux et sciures - si possible, sinon bâchage des machines et de l'environnement : les copeaux et sciures sont très nocifs pour les machines! - Tous les copeaux et sciures doivent être récupérés - Des copeaux et sciures doivent être mis près pour empêcher la chute d'outil, visserie... sur une machine sous peine de les endommager		✓ ✓ ✓ ✓

	• Ramassage au fur et à mesure des décombres • Les jeter dans le compacteur ou benne à ferraille • Les machines et les lieux devront rester propres pendant toute la durée des travaux		✓ ✓ ✓
Véhicules	• Vitesse limitée à 20 km/h • Stationnement sur les places de parking devant l'usine • Ne pas stationner devant les différents portails • Après déchargement, les camions seront stationnés le long de la voie de contournement de l'usine		✓ ✓ ✓ ✓
Outillage électroportatif	• Nécessité d'un bon de feu journalier pour travaux par point chaud • Port des protections individuelles • Outillage conforme et en bon état		✓ ✓ ✓
Blessures Risques de chute	• Respect des balisages autour des trous niv. 00 • Pose d'échafaudage ou port du harnais de sécurité pour travaux en hauteur		✓ ✓
Écrasement/blessures	• Port des chaussures de sécurité • Pose de gants lors de manutentions • Port du casque • La zone autour de l'échafaudage devra être balisée		✓ ✓ ✓ ✓
Manutentions lourdes	• Conduite de chariots élévateurs par caristes munis de leur permis à jour, uniquement • Élingage dans les règles de l'art • Respect du périmètre de protection autour des pièces suspendues, baliser la zone lorsque la manutention se prolonge • Pas de travaux sous pièces suspendues		✓ ✓ ✓ ✓
Date : 25/08/14 Demandeur des travaux : Visa Responsable fabrication : Visa	Date : 25/08/14 Les instructions et mesures arrêtées lors de la visite préalable sont à transmettre au personnel de l'EE par le responsable sur le site. Responsable sur le site de l'EE : Visa :		

En pratique :

À éviter :

Ne Laissez pas un problème s'installer sans réagir. Principes :

- Utilisez le rapport de réunion extraordinaire de façon exceptionnelle lorsqu'un événement imprévu s'immisce dans le projet.
- Cet outil est rédigé et validé lors de la réunion dite extraordinaire.

Astuce :

Proposez une codification permettant un bon archivage.

L'essentiel :

- Le formulaire analyse des risques est à lire et faire signer en même temps que les bons de travaux.
- Ces formulaires sont à remplir avant le début des travaux.
- La fiche est à remplir par chaque intervenant extérieur.

VIII – Suivi des heures

Un projet est composé de différentes tâches interdépendantes les unes des autres. Suivre les heures affectées à une tâche permet d'éviter les dérives, d'évaluer la performance des collaborateurs, de vérifier la pertinence des budgets estimés lors du chiffrage initial, etc. Cet outil se caractérise comme une mission de contrôle effectuée sur les différents acteurs du projet ou responsables techniques. Il permet particulièrement de mettre à jour le planning initial en effectuant une surveillance des heures affectées aux différentes tâches d'un projet.

L'outil de suivi des heures se définit sous la forme d'une fiche d'heures remise à tous les responsables techniques ou acteurs du projet. Après avoir été complétée, la fiche d'heures est confiée au chef de projet pour analyse.

EXEMPLE :

L'exemple ci-après (voir page suivante) concerne la phase de mise en route d'une ligne de production.

En pratique :

À éviter :

Un suivi partiel ou irrégulier est déconseillé.

Principe :

Le suivi des heures doit se faire périodiquement sur une durée permettant au chef de projet de réagir rapidement en cas de dérive. Il ne concerne pas le suivi individuel du personnel mais plutôt de l'ensemble du personnel sur une tâche particulière.

L'essentiel :

- L'outil permet d'éviter les dérives, d'évaluer la performance des collaborateurs, de vérifier la pertinence des budgets estimés lors du chiffrage initial, de tracer les raisons pour les écarts.
- La fiche d'heures est confiée au chef de projet pour analyse

Rapport hebdomadaire – Collaborateur					
État d'avancement projet : Semaine : 06/2014	Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Jour 5
	100 %	100 %	100 %	110 %	110 %
Commentaires : Mise en route ligne 3. Projet: TBCAL10					
Jour 1	RAS				
Jour 2	Pb – Arrêt machine principale durant 2 heures. Équipe immobilisée				
Jour 3	Relance machine normale. Nécessité d'augmenter la durée de travail pour respecter les délais?				
Jour 4	Accord du chef de projet pour augmenter d'une heure le temps de travail. Malgré l'augmentation, le retard n'est pas rattrapé. Nécessité de garder les salariés 1 heure supplémentaire demain.				
Jour 5	Pour rattraper le retard, une heure supplémentaire de travail a été nécessaire. Retard rattrapé.				
Bilan fin de semaine : ☐ Projet avancé ☐ Projet retardé Raison(s) principale(s) : Incident machine principale. Problème pièce M267-P2 section refroidissement machine. Raison : usure normale. Pièce commandée à 10 h 30. Arrivée à 14 h 00. Équipe immobilisée durant 2 heures. Émargement : Raymonde POVOLSKI Date : 25/02/14					
Analyse – Chef de projet					
Conséquence financière – Prise en charge de 6 heures supplémentaires (2 heures pour 3 salariés). Coût remplacement pièce.					
Commentaire – Marge bénéficiaire réduite de 2 %.					
Émargement – François BRECHINT Date : 27/02/14					

IX – Dossier projet

Quel que soit le type de projet ou la phase d'avancement du projet, un seul document doit faire l'objet d'une attention particulière de la part du chef de projet, c'est le dossier projet. S'il ne devait en exister qu'un, ce serait celui-ci. Cet outil permet d'assurer le suivi documentaire d'un projet de taille moyenne (inférieure à 12 mois par homme) et plus précisément de lancer, de réaliser, de suivre et d'établir un bilan du projet. Il peut paraître fastidieux de mettre en place un suivi documentaire pour un petit projet. Mais, sauf abandon du projet (et encore), la vie du projet

ne s'arrête pas à la livraison d'une réalisation mais souvent lorsqu'un nouveau projet vient se substituer au premier. Ainsi, ce document pourra servir de base de connaissance à toute personne susceptible d'avoir à intervenir dans le cadre du projet. Quel que soit le moment, ce document constituera une mine d'informations et, surtout, un gain de temps appréciable à celui qui le consultera. Le dossier projet détaille l'ensemble des phases qui sont abordées durant le projet. Nous y retrouverons un descriptif du document, le contexte dans lequel se déroule le projet, les phases de définition, conception et réalisation du projet ainsi que le bilan.

Astuce : l'étude d'opportunité, l'étude de faisabilité ou encore le cahier des charges peuvent servir de base à la rédaction de cet outil.

1. Descriptif du document

Ce chapitre présente les évolutions apportées au document durant le projet.

A. Objet du document

Vous préciserez le projet auquel ce document fait référence.

EXEMPLE :

Ce document constitue le dossier du projet de migration d'un référentiel décisionnel.

Ensuite, vous énumérerez les objectifs du dossier projet qui se composent des informations suivantes :

- le contexte du projet ;
- l'ensemble des documents livrables au cours du cycle de vie du projet ;
- une information à tous les participants au projet sur les procédures, règles et méthodes applicables ;
- l'apport à tous les participants au projet des éléments leur permettant d'organiser, de planifier et de réaliser leurs activités ;
- les moyens permettant de fournir les livrables ;
- l'aide à la mise en œuvre du projet et le suivi de sa réalisation ;
- l'assurance d'une centralisation de l'ensemble de la documentation du projet ainsi que les références documentaires.

Le dossier répond ainsi aux questions :

- Qui, Où et Quoi concernant l'existant et détaillées dans la partie consacrée au contexte du projet.
- Quoi, Comment et Qui pour le projet et expliquées dans les parties définition, conception et mise en œuvre.

B. Documents de référence

Concernant les documents de référence servant de base à l'ensemble des acteurs intervenant dans le projet, un simple tableau suffit à les inventorier. Ainsi, quatre informations constitueront ce tableau : un libellé (ou descriptif), le titre, la version et la date de publication.

EXEMPLE :

Libellé	Titre	Version	Date
Annuaire du personnel de l'entreprise	Annu2014	V03	01/01/2014

C. Maîtrise du document

Vous y préciserez la personne responsable de la définition et de la rédaction du dossier projet ainsi que des documents annexés. En règle générale, il s'agit du chef de projet de la maîtrise d'œuvre. Dans le même ordre d'idée, vous préciserez le processus retenu lors de chaque revue du dossier projet et avant diffusion conformément aux règles internes des processus « gestion des revues » et « gestion de la documentation » ainsi que la traçabilité des évolutions qui seront relatées dans le tableau des évolutions se trouvant en tête du document.

EXEMPLE :

Définition et rédaction : François BRECHINT

Tableau des évolutions				
Version	Date	Nature de la modification	Auteur	Page
01	13/04/2014	Création	BRECHINT F.	
02	23/05/2014	Mise à jour des spécifications fonctionnelles	COSTA A.	12

2. Contexte du projet

L'ensemble des informations à faire apparaître dans cette rubrique est illustré dans l'étude de faisabilité.

3. Définition du projet

Ce chapitre contient l'expression des exigences techniques, fonctionnelles et organisationnelles, les contraintes de mise en œuvre et les chiffres importants liés au projet.

A. Exigences

D'un point de vue fonctionnel, il s'agit de présenter tous les besoins exprimés par la maîtrise d'ouvrage. Pour ce faire, l'Outil– Étude d'opportunité pourra servir de base à la rédaction de cette rubrique. Ainsi, y figureront toutes les demandes élémentaires formulées par la maîtrise d'ouvrage et celles moins importantes considérées comme optionnelles. Au même titre que les exigences fonctionnelles, il sera nécessaire de préciser les exigences techniques formulées par la maîtrise d'ouvrage. Enfin, l'aspect organisationnel ne doit pas faire figure de parent pauvre. En effet, il devient même primordial lorsqu'il s'agit d'assurer une continuité de service et, le cas échéant, il devient réellement vital lorsqu'il s'agit de service de soins.

B. Contraintes de mise en œuvre

Face aux demandes exprimées par la maîtrise d'ouvrage, il convient également de présenter l'ensemble des contraintes afférentes à la mise en œuvre du projet. Ainsi, quatre types de contraintes sont susceptibles de se présenter à vous :

Délais – La contrainte de délai peut être imposée par la maîtrise d'ouvrage, réglementaire ou tout simplement calendaire.

EXEMPLE :

La mise en conformité des applications informatiques pour le passage au 1^{er} janvier 2000 est une contrainte calendaire non négociable.

Ressources – La liste des ressources peut être de type humain, matérielle ou encore financière. Dans tous les cas, elles sont à définir et à quantifier dès le démarrage du projet. Une bonne planification de ces ressources permettra de voir si la capacité interne est suffisante ou s'il faut faire appel à des ressources extérieures en début ou en cours de projet.

Conseil : Une mauvaise estimation initiale des besoins en ressources représente un risque d'échec pour le projet. Dans ce cas, une négociation avec la maîtrise d'ouvrage peut s'envisager mais elle sera délicate et fastidieuse.

Organisation – La contrainte d'organisation présente les démarches à entreprendre pour assurer le bon déroulement du projet.

EXEMPLE :

Toute intervention sur les machines de production doit se faire impérativement en dehors des heures de production, c'est-à-dire le week-end ou les jours fériés.

Techniques - Les contraintes techniques peuvent aussi bien concerner le matériel, que l'environnement, l'architecture ou encore la compatibilité entre logiciels. Les décrets, arrêtés, normes et règles en vigueur concernant le projet seront exposés ici.

C. Volumétrie

Ce chapitre permet un relevé de l'ensemble des indicateurs quantifiables relatifs au projet.

EXEMPLE :

Pour un projet informatique, il conviendrait de préciser :

- Le volume de donnée initiale, soit reprise des données du système existant : 1 million de lignes de commandes, soit 6,5 Go (6 ans).
- Le rythme d'évolution des données : 10 000 lignes de commandes par mois.
- L'historisation : besoin statistique d'accès aux données en ligne sur les cinq exercices précédents et réglementairement sur les trois derniers exercices. Il n'est envisagé aucune procédure d'archivage.
- Le nombre d'utilisateurs finaux : 540.
- La durée maximum d'interruption du système accepté : 4 heures.

À noter : ces quelques exemples n'ont aucune prétention d'exhaustivité.

Astuce : pour une efficacité accrue, il est conseillé de regrouper l'ensemble des chiffres clés du projet dans cette rubrique.

4. Conception d'un projet

Indiquez ici l'ensemble des spécifications d'environnement, fonctionnelles, techniques, d'architecture, d'organisation ainsi que d'autres points à prendre en compte durant le projet.

A. Spécifications fonctionnelles

Les informations mentionnées dans cette rubrique sont une traduction formalisée des besoins exprimés par la maîtrise d'ouvrage. Ainsi, les spécifications fonctionnelles générales donneront les grandes lignes du projet et les spécifications fonctionnelles détaillées développeront chaque fonction et sous-fonction attendue.

EXEMPLE :

Fonction : Gestion de stock.

Sous-fonction : Traçabilité.

Toutes les modifications apportées aux données feront l'objet d'une synthèse quotidienne qui permettra de savoir notamment :

- La valeur du stock avant modification.
- L'auteur de la modification.
- La date de modification.
- La valeur du stock après modification.

Ces traces seront conservées sur une durée qui devra être paramétrable.

B. Spécifications environnementales

Quel que soit le type de projet, ce dernier s'inscrit toujours dans un contexte existant. Ainsi, qu'il s'agisse de la construction d'un bâtiment, de la mise en place d'une nouvelle machine-outil ou d'un nouveau programme applicatif, les règles appliquées à l'existant peuvent avoir une influence sur le projet.

EXEMPLE :

Pour la construction d'un bâtiment, indiquez les spécificités liées au plan d'occupation des sols, la présence d'une nappe phréatique. Pour la mise en place d'une application informatique, précisez le système d'exploitation et l'ensemble des contraintes d'architectures applicatives.

C. Spécifications techniques

Nous y trouverons toutes les informations techniques nécessaires à la mise en place du projet.

EXEMPLE :

Dans le domaine informatique, nous pourrions notamment trouver dans cette rubrique :

1. Des normes et des standards

- Description du processus de stockage de données (base de données, fichiers, gestionnaire de base de données, droits d'accès aux données).
- Description du contenu des postes de travail.
- Description du processus d'impression.
- Description de l'ergonomie des applications.
- Description des interfaces.
- Description des plates-formes (tests d'intégration, formation, production) et matériels associés.

2. De la sécurité

- Description des procédures assurant la disponibilité et la continuité de service avec notamment les procédures dégradées.
- Contrôle et intégrité des données.
- Protection des données.

- Droits d'accès.

3. Des sauvegardes

- Description des procédures de déclenchement (base de données, autres gestionnaires de données).
- Restauration des données.
- Archivage.

4. Des performances

On y traitera des temps de réponses par fonctionnalités, des durées pour les impressions, des scénarios de montée en charge et des capacités d'évolution de la solution.

5. Gestion des données

Description des fonctions des intervenants dans l'administration des données (Base de données et autre gestionnaire de données).

6. Exploitation

Ensemble des procédures techniques à réaliser lors du démarrage de l'application ainsi que durant l'exploitation normale sans oublier les opérations particulières telles que celles de la fin de la journée ou de la nuit.

D. Spécifications d'architecture

Au même titre que les spécifications techniques, une description de l'ensemble de l'architecture retenue sera à exposer dans ce chapitre. Ainsi, nous y trouverons, par exemple, une description de toutes les plates-formes utilisées.

E. Spécifications organisationnelles

L'approche organisationnelle consiste à décrire toutes les actions à mettre en œuvre au cours du projet pour assurer une gestion optimum des ressources humaines et matérielles.

EXEMPLE :

Pour chaque intervenant dans le cadre du projet, une description précise des missions à réaliser sera un des facteurs de garantie du respect du planning. Ou encore : le déplacement d'une équipe se fera uniquement lorsque l'on aura la certitude que tout le matériel est en place pour les accueillir.

F Autres spécifications

Nous n'avons abordé qu'une partie des spécifications concernant le projet. D'autres caractéristiques viennent compléter cette approche et notamment les suivantes.

■ Formation/Accompagnement

Dans un premier temps, il est nécessaire de faire monter les équipes techniques en compétences afin d'être opérationnelles dès le premier jour de mise en production. Ainsi, un plan de formation détaillé et prévisionnel doit être mis en place afin de garantir une efficacité optimum des interventions le cas échéant. Au même titre que le personnel technique, le plan de formation utilisateurs doit être mis en place et transmis aux utilisateurs concernés 1 à 2 mois avant la première formation.

Conseil : l'envoi d'une convocation au plus tôt 15 jours avant la première formation pourra servir de rappel.

EXEMPLE :

Formation de cadres à la prise en main d'un programme informatique

Nom et prénom de l'utilisateur/ Service	Module de formation			Date	
	Novice	Expert	Métier	N° Semaine Disponible	au + tard
F. BRECHINT Chef de projet	10/05/14	11/05/14	12 au 14/05/14	18, 19, 20, 21	21
S. DUMONT Responsable de production	10/05/14		12 au 14/05/14	19, 20	21
M. MEYER Directeur d'usine	10/05/14			20	21

■ Procédure d'installation

Selon le contexte du projet, la nature stratégique et l'ampleur des actions à mener, il peut être opportun de se référer à une annexe. Dans le cas contraire, une description précise permettant d'exposer les actions à mener lors de l'installation sera à formaliser dans cette rubrique. L'ensemble des spécificités devra faire l'objet d'une description précise.

■ Tests

Les tests peuvent être de deux types :

- Unitaires : dans ce cas, les tests s'effectuent dans un environnement clos, ce qui permet de vérifier le bon fonctionnement de la solution sans interférence externe.
- D'intégration : ces tests sont équivalents à une mise en situation de fonctionnement réel.

Il convient pour chacun de ces types de test d'établir des scénarios qui assureront une non-régression des performances et le bon fonctionnement des évolutions.

■ Reprise

Une reprise de personnel, de bâtiment, de machines-outils ou encore de données informatiques peut faire partie du projet. Dans ce cas, une description détaillée de la procédure de reprise sera exposée dans cette rubrique.

EXEMPLE :

Reprise du fichier client : le fichier client sera extrait de l'ancienne application de gestion commerciale au format texte. Le fournisseur de la nouvelle application de gestion des commandes clients aura en charge de reprendre ce fichier complet. La personne interne assurant la validation de cette intégration sera M. Antoine COSTA.

■ Paramétrage

Toute action relevant d'une spécificité concernant un utilisateur, un service ou un site fera l'objet d'un relevé dans cette rubrique. Il peut être opportun de créer une annexe spécifique à cette rubrique. Dans ce cas, la référence sera précisée

■ Mise à disposition

Selon le contexte, la mise à disposition peut se traduire par le démarrage de la production, par la diffusion d'une application informatique, etc. Dans tous les cas, elle concerne un public cible, les destinataires, qu'il conviendra d'identifier. Dans un deuxième temps, il sera nécessaire de répondre à la question « Comment ? », ce qui permettra d'inventorier les actions à réaliser. Enfin, une recette sera réalisée avec chaque destinataire, pour garantir la conformité et le bon fonctionnement de la solution mise en place. La recette abordera autant la phase de démarrage et de production que la maintenance et l'assistance.

Conseil : la maintenance et l'assistance peuvent faire l'objet de rubriques supplémentaires pour bien décrire les procédures lorsqu'elles peuvent paraître complexes ou nécessitent un niveau de détail conséquent.

EXEMPLE :

Diffusion d'une application informatique – Vu le nombre d'utilisateurs finaux cibles (cf. liste ci-jointe), la diffusion de l'application se fera par l'intervention d'un technicien sur tous les postes concernés. Un rendez-vous fixé préalablement par le technicien laissera à chaque utilisateur le temps de prendre ses dispositions pour libérer l'accès au poste de travail. L'utilisateur aura 30 jours pour effectuer la recette de l'application mise à disposition. À l'issue de cette période, un rapport mentionnant les éventuelles réserves sera transmis au chef de projet.

■ Les procédures d'astreinte

Les procédures d'astreintes ont pour objectif de décrire les actions à mener en dehors des heures de travail normales de l'entreprise. À ce titre, la personne en charge d'une intervention doit être en mesure de pouvoir rétablir une situation jugée comme normale. Ainsi, une fiche d'astreinte doit être suffisamment complète pour qu'une intervention puisse être réalisée sans connaissances particulières. Néanmoins, un ou des experts peuvent intervenir en support en cas de nécessité.

EXEMPLE :

En cas d'incendie dans la salle des machines, l'appel aux pompiers de l'entreprise doit se faire prioritairement. Ensuite, le responsable de production doit être averti dans les meilleurs délais. Les numéros de téléphone tenus à jour se trouvent dans le classeur « Astreinte/Personnes à contacter ».

■ Communication

Dernier volet des spécifications et non des moindres, la communication. À elle seule, elle nécessiterait plusieurs publications mais nous n'allons en retenir que la quintessence : « Communiquer, c'est émettre un message vers un destinataire ». Malheureusement, on oublie trop souvent de vérifier d'une part que le message est bien reçu et d'autre part qu'il a été compris. La communication est omniprésente tout au long du projet, elle doit donc faire l'objet d'une attention particulière qui peut se concrétiser au travers d'un plan. Aussi minimaliste soit-il, un bon plan de communication permettra de diffuser le ou les messages au moment opportun à son destinataire.

Conseil : il est préférable d'avoir un message court et clair que de se perdre dans de longues explications susceptibles d'être interprétées de mille façons différentes. Cela est particulièrement vrai pour des domaines techniques où une dérive souvent constatée est de se servir du message en tant que justification.

Truc : pour s'assurer de la bonne compréhension de son message, soumettez le message à quelques destinataires représentatifs puis recueillez leurs remarques pour corriger le message en conséquence.

Pour aller plus loin dans l'efficacité, il est possible de compléter le message par une phrase proposant de trouver d'autres informations sur le sujet en consultant un document ou un ouvrage que vous prendrez le soin de citer.

Cette démarche permet de ne pas polluer un message avec des informations ne concernant qu'une partie des destinataires et propose des précisions à ceux qui le souhaitent.

EXEMPLE :

Voici mon message... blabla et vous terminez par : Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, ci-joint quelques pistes d'explication plus techniques :

- complément de message ;
- références documentaires.

5. Mise en œuvre et réalisation du projet

Dans ce chapitre, vous décrirez l'organisation et la coordination du projet ainsi que les livrables à fournir. Nous y trouverons également les tableaux de suivi (ressources et coûts) ainsi que l'assurance qualité.

A. Organisation et coordination

La structure organisationnelle du projet mis en place doit faire l'objet d'une description précise. Celle-ci passe obligatoirement par une définition précise des rôles, des responsabilités et des obligations de chacun.

Conseil : une complémentarité efficace entre les différents intervenants du projet augmente les chances de réussite du projet.

EXEMPLE :

Organisation et coordination du projet		
Structure	Composition – Identification	Rôles – Responsabilités – Obligations
Maîtrise d'ouvrage	Maurice MEYER	Directeur d'usine/Financier
Groupe projet	Sylvain DUMONT	Responsable production
	Julie ROBERT	Assistante à maîtrise d'ouvrage
	Stéphanie MARCHAND	Responsable qualité
	François BRECHINT	Chef de projet
	Gérard KLAUS	Ouvrier
Direction et services concernés – Référénts	Embouteillage	
Groupe utilisateurs	Équipe T3	Utilisateurs pilotes
Responsable projet MOE	François BRECHINT	Chef de projet

B. Livrables

Un livrable est le nom donné à tout composant matérialisant le résultat d'une prestation de réalisation, c'est-à-dire toute production réalisée au cours d'un projet. Ainsi, au cours de chaque étape d'un projet, des livrables peuvent être fournis aux différents intervenants. De manière à obtenir une lecture rapide, une présentation sous forme de tableau permettra de faire apparaître toutes les informations en fonction des événements.

Les informations élémentaires sont les suivantes :

- la phase du projet ;
- l’activité ou l’événement ;
- la date prévisionnelle de mise à disposition ;
- le livrable.

Ce tableau peut être enrichi de trois autres colonnes donnant les informations suivantes :

- la personne en charge du livrable ;
- le destinataire du livrable ;
- la date de livraison réelle.

Un simple aperçu du tableau donnera donc tous les éléments pour répondre à la question : « Qui livre quoi et quand ? »

EXEMPLE :

Livrables au cours d’un projet informatique (liste non exhaustive).

Phases	Activités – Événements	Date prév.	Livrables
Avant-projet	Qualification du besoin Définition des objectifs Exigences fonctionnelles, techniques et organisationnelles	02/01/2014	Étude d’opportunité Étude de faisabilité Cahier des charges
	Revue Phase avant-projet	28/02/2014	Compte rendu
Appel d’offres	Réception appel d’offres Chiffrage Proposition d’une offre Réception commande Contractualisation de la collaboration	01/03/2014	Revue appel d’offres Offre Revue d’offre Revue d’entrée de commande Contrat
	Revue Phase appel d’offres	14/04/2014	Compte rendu
Définition	Définition des procédures et besoins liés au projet	18/04/2014	Procédure projet Plan de financement Plan d’assurance qualité Dossier projet
	Revue Phase définition	31/05/2014	Compte rendu
Organisation et conception	Mise en place management et organisation Spécifications fonctionnelles générales, échanges de données externes ou internes Spécifications techniques générales : logiciel et matériel Spécifications générales d’architecture Spécifications organisationnelles	01/06/2014	Plan de contribution Analyse des risques Plan qualité Confidentialité Planification Plan de communication
	Revue Phase organisation	15/09/2014	Compte rendu

Préparation – Mise en œuvre	Définition des opérations nécessaires au changement Préparation formation	18/09/2014	Dossier projet actualisé
	Revue Phase préparation	31/10/2014	Compte rendu
Analyse détaillée et réalisation	Spécifications détaillées : fonctionnelles, techniques, organisationnelles, complémentaires Conception détaillée interfaces et réalisation Préparation Plates-formes Tests Paramétrage Déploiement sur site pilote Formation, transfert compétences techniques	02/11/2014	Dossier projet actualisé Manuel utilisateur Manuel d'installation Plan de tests
	Revue Phase analyse	09/02/2015	Compte rendu
Intégration	Tests et recette technique d'intégration Tests et recette fonctionnelle Paramétrage Reprise des données Vérification des performances Définition des procédures d'astreintes Démarrage site pilote	12/02/2015	Dossier projet actualisé Procédures d'astreintes Support de formation Dossier CNIL
	Revue Phase intégration	13/04/2015	Compte rendu
Mise en œuvre	Formation utilisateurs Tests site pilote Réception et qualification du système Déploiement	21/05/2015	Dossier projet actualisé Outils de suivi actualisés Convocation formation Fiche de réception
	Revue Phase mise en œuvre	31/08/2015	Compte rendu
Clôture	Clôture du projet Recette – Bilan Capitalisation et recherche d'amélioration Transfert vers les équipes support	03/09/2015	Dossier projet actualisé Enquête de satisfaction Bilan projet
	Revue Phase clôture	14/09/2015	Compte rendu

C. Ressources prévisionnelles et réelles

Le tableau suivant synthétise les informations détaillées dans l'Outil– Planification.

Outre la présentation des ressources prévues et celles réellement consommées, les colonnes « Écart » et « Raisons » viennent soutenir les chiffres.

EXEMPLE :

Phases	Activités – Événements	Prévu	Réel	Écart	Raisons
Avant-projet	Qualification du besoin Définition des objectifs Exigences fonctionnelles, techniques et organisationnelles	40	40	0	
Total		40	40	0	
Appel d'offres	Réception appel d'offres Chiffrage Proposition d'une offre Réception commande Contractualisation de la collaboration	33	33	0	
Total cumulé		73	73	0	
Définition	Définition des procédures et besoins liés au projet	29	24	– 5	Disponibilité à 100 %
Total cumulé		102	97	– 5	
Organisation et conception	Mise en place management et organisation Spécifications fonctionnelles générales, échanges de données externes ou internes Spécifications techniques générales : logiciel et matériel Spécifications générales d'architecture Spécifications organisationnelles	75	66	– 9	Disponibilité à 100 %
Total cumulé		177	163	– 14	
Préparation – Mise en œuvre	Définition des opérations nécessaires au changement Préparation formation	32	26	– 6	Accès facile aux informations
Total cumulé		209	189	– 20	

Analyse détaillée et réalisation	Spécifications détaillées : fonctionnelles, techniques, organisationnelles, complémentaires Conception détaillée interfaces et réalisation Préparation plates-formes Tests Paramétrage Déploiement sur site pilote Formation, transfert compétences techniques	70	78	+ 8	Charge paramétrage sous-estimée
Total cumulé		279	267	- 12	
Intégration	Tests et recette technique d'intégration Tests et recette fonctionnelle Paramétrage Reprise des données Vérification des performances Définition des procédures d'astreintes Démarrage site pilote	44	44	0	
Total cumulé		323	311	- 12	
Mise en œuvre	Formation utilisateurs Tests site pilote Réception et qualification du système Déploiement	74	84	+ 10	Période de vacances manque de disponibilité pour formation
Total cumulé		397	395	- 2	
Clôture	Clôture du projet Recette – Bilan Capitalisation et recherche d'amélioration Transfert vers les équipes support	10	10	0	
TOTAL PROJET		407	405	- 2	

D Coût prévisionnel et réel

Au même titre que le tableau précédent, l'aspect coût fait l'objet d'une synthèse dans le dossier projet. Le détail de l'ensemble des coûts est quant à lui présenté dans l'outil chiffrage. Le tableau recense l'ensemble des points financiers par une approche thématique.

EXEMPLE :

Coût estimé/réel en K€					
	Prévu	Réel actualisé		Prévu	Réel actualisé
Jours/Hommes	122,10	121,50	Accompagnement	3,00	3,00
Matériels	35,00	34,65	Formation	10,00	10,00
Logiciel	22,00	21,10	Monitorat	2,40	2,10
Maintenance	4,60	4,22	Autres	2,00	1,20
Interface	0	0	Total	201,10	197,77

E. Assurance qualité

Ce chapitre rappelle les dispositions prises au niveau du management de la qualité pour contribuer à la maîtrise du projet. Lorsque l’Outil – Plan d’assurance qualité est utilisé dans le cadre du projet, ce dernier peut servir de support pour compléter cette rubrique.

■ Revues de phase projet

Les revues sont prévues en fin de phase et destinées à s’assurer que :

- les objectifs du projet sont identiques aux objectifs initiaux ;
- les objectifs des phases antérieures sont atteints ;
- les objectifs des phases suivantes sont suffisamment explicites et compris par tous ;
- la planification est réaliste par rapport à l’avancement du projet ;
- les risques sont constamment pris en compte dans toute action relative au projet ;
- les documents utilisés sont inventoriés et mis à jour lors de chaque revue.

■ Maîtrise des documents

Les documents et livrables utilisés respectent les standards internes d’identification et de présentation.

Les procédures en cas de changements ou d’évolutions sont appliquées. Elles concernent la qualification, l’approbation, la diffusion et l’archivage des documents.

■ Procédure de traitement des non-conformités

Cette procédure doit permettre de mieux gérer les demandes de modifications éventuelles apportées au projet alors qu’il est déjà lancé afin d’éviter tout dérapage de délai et de coût.

Pour ce faire, il convient de :

- définir et classer les demandes de modifications (correction d’anomalies, demande d’évolution...).
- respecter le processus de gestion des changements ;
- identifier les responsabilités associées ;
- analyser les répercussions en cascade sur le produit en cours de développement.

Conseil : pour une meilleure gestion des modifications, nous vous conseillons d’utiliser l’Outil – Suivi des non-conformités.

■ Gestion de la configuration

La gestion de la configuration permet d’assurer la gestion des composants qui constituent le produit final du projet. Elle comporte :

- La description précise de chaque composant : documents, éléments logiciels, matériels et fiches de suivi.

- La configuration et les numéros de versions : description de la procédure de mise en configuration, de la gestion des modifications et des évolutions.
- La traçabilité des configurations livrées.

■ Procédure de suivi des litiges/incidents

Un litige/incident est un événement interne ou externe subi par le projet et pouvant affecter son organisation ou sa production. En cas de détection d'un incident, le responsable de projet devra :

- l'analyser : cause, étendue, conséquences ;
- le classer par nature : matériel, logiciel, ressources... ;
- proposer les actions préventives et correctives ;
- rédiger une fiche Suivi de litige (voir Outil – Suivi des litiges) et assurer son suivi.

■ Maîtrise de la sécurité

Les consignes appliquées concernent :

- les accès physiques et logiques à tous les composants du projet ;
- l'archivage et son accès à ces composants ;
- l'accès aux systèmes d'information ;
- la confidentialité appliquée aux données.

■ Bilan qualité sur le management de projet

En fin de projet, il est préconisé de réaliser un bilan. Ce dernier a pour objectif :

- d'évaluer la façon dont le projet a été réalisé ;
- d'identifier les améliorations à apporter aux processus utilisés.

À ce titre, la rubrique suivante en est une illustration.

6. Bilan de projet

Le dossier projet ne serait pas complet s'il n'y apparaissait pas un résumé de ce qui a été fait durant le projet. Ce chapitre permet donc de faire le point sur le projet et notamment de faire un bilan général, un bilan des relations, une évaluation technique, un bilan administratif du projet, de la maintenance, de la qualité et, enfin, une capitalisation sur l'expérience acquise.

Principe : Le bilan du projet ne s'anticipe pas. Il est à réaliser lorsque le projet est terminé de manière à avoir le recul nécessaire pour bien analyser les différentes situations vécues.

A. Évaluation générale du projet

L'approche globale a pour but, dans un premier temps, d'analyser et comparer le réalisé par rapport au prévisionnel. Il ne s'agit pas seulement de faire apparaître des chiffres mais aussi d'expliquer les écarts. Ensuite, la présentation d'une synthèse des événements significatifs de chaque phase sera une très bonne illustration de la vie du projet. Si vous ne vous souvenez pas d'un détail, c'est qu'il n'a pas lieu d'être cité dans le bilan.

Enfin, si vous ne les avez pas mentionnés précédemment, vous terminerez par une synthèse et une analyse des incidents rencontrés.

B. Bilan des relations

Le chef de projet a un rôle central dans un projet. Son analyse sera donc pertinente pour présenter la situation des relations avec les différentes parties prenantes au projet. À ce titre, un premier bilan fera apparaître les relations avec la maîtrise d'ouvrage et avec les utilisateurs

finaux. Dans un second temps, seront précisés les rapports avec les équipes techniques d'une part mais aussi avec les différents fournisseurs d'autre part.

C. Évaluation technique du projet

Inutile de reprendre les informations contenues dans les spécifications techniques, il s'agit uniquement d'évaluer la solution technique mise en place. Complétée par un point de vue externe au projet, l'évaluation n'en sera que mieux considérée. Un inventaire des outils et méthodes utilisés durant le projet viendra étayer la présentation technique précédente. D'un point de vue environnemental, il sera bon de rappeler l'ensemble des spécificités liées au projet. Il peut s'agir de terrain, de bâtiment, de matériel ou encore d'environnement informatique ; la liste n'est pas exhaustive. Pour finir, une évaluation de la prestation logistique viendra compléter la synthèse technique. Le volet logistique est décrit aussi bien par les livraisons successives que par l'organisation globale du projet.

D. Formation

Le bilan global de la formation se fait à partir des évaluations de fin de formation de chaque personne formée. L'analyse portera sur les conditions matérielles, le contenu de la formation, les compétences pédagogiques du ou des formateurs, la durée de la formation, le rythme, le nombre d'exercices, etc.

E. Bilan administratif du projet

Le bilan administratif ne se résume pas aux seuls coûts mais aussi au bilan des ressources humaines, contributions internes et externes et de la documentation. En ce qui concerne les coûts, il s'agit de faire apparaître les coûts directs et indirects. Les coûts directs sont relativement faciles à faire apparaître car ils font l'objet d'une facturation. La difficulté réside dans le calcul des coûts indirects. Estimer la participation des différents intervenants internes, de la secrétaire à l'ingénieur, est un exercice complexe auquel il faut ajouter les coûts relatifs aux matériels utilisés. En effet, la mobilisation d'une machine-outil interne pour la réalisation d'une pièce spécifique à votre projet représente un coût. Dans le même ordre d'idée, l'arrêt d'une chaîne de production pour que vous puissiez intervenir dans le cadre de votre projet engendre un coût de non-production, quelques fois des retards de livraison, voire des pénalités auprès de vos clients.

Le bilan en ressources humaines peut se présenter sous la forme de tableau faisant apparaître les besoins initiaux selon le type de profil et les ressources ayant réellement participé. Seront identifiées comme contributions internes et externes toutes les participations ponctuelles au projet quelle que soit la nature de l'intervention. Enfin, à partir de l'Outil – Suivi de la documentation, nous pourrons réaliser une synthèse des documents créés.

F. Les livrables

Lorsque le livrable du projet a été transmis à la maîtrise d'ouvrage, il passe en phase de production associée à une maintenance. Cette dernière fait l'objet d'une description synthétique permettant de répondre aux questions : qui fait quoi et quand ?

Truc : il est nécessaire de bien faire apparaître le ou les protocoles de validation.

G. Capitalisation de l'expérience

Nous nous attacherons à la présentation de trois aspects.

La conduite de projet – Celle-ci fera apparaître autant les points positifs que négatifs.

EXEMPLE :

Point positif : le télétravail des analystes participant au projet a permis une diminution des coûts de structure significative.

Point négatif : la communication entre l'ensemble des intervenants du projet a été rendue difficile suite à la mise en place du télétravail.

Un point périodique avec l'ensemble des intervenants du projet s'avère indispensable pour ne pas perdre le bénéfice du télétravail.

Les problèmes récurrents à surmonter – Lorsque certains problèmes apparaissent plusieurs fois, et surtout s'ils sont susceptibles de se représenter, il est nécessaire de les faire apparaître dans la gestion des risques avec la solution associée.

EXEMPLE :

Le déclenchement de l'alarme dans la salle des machines fait suite à une montée en charge des moteurs qui dégagent ponctuellement une plus grande chaleur. L'éloignement des capteurs de l'alarme permettra de régler le problème sur le long terme.

Les mesures particulières – Pour le bon déroulement du projet, il peut être nécessaire de prendre certaines mesures temporaires.

EXEMPLE :

Les réunions du groupe projet se dérouleront dans notre filiale située à Paris et non au siège social de Fontaine-Guérin.

Enquête de satisfaction – Dans un souci constant de recherche d'amélioration, l'Outil– Enquête de satisfaction s'avère être très utile. À ce titre, une synthèse faisant apparaître les points de vue significatifs de la maîtrise d'ouvrage et des utilisateurs finaux viendra clore le bilan du projet.

Conseil : soyez neutre.

7. Annexes

Les annexes seront regroupées en fin de document. Il sera notamment possible d'y rappeler un lexique des termes utilisés, les codes utilisés et l'index de référence ou encore un lexique des mots clés.

L'essentiel :

- Cet outil permet d'assurer le suivi documentaire d'un projet.
- S'il ne devait en exister qu'un, ce serait celui-ci.
- Il sert de base de connaissance.
- Le bilan doit être neutre.

X – Gestion des modifications

Un projet est clairement identifié par un cahier des charges qui traduit l'expression d'un besoin formulé par un client. Le prestataire répond au client en lui soumettant une offre. Après entente entre les deux parties, le projet est lancé. Il peut néanmoins arriver qu'en cours de réalisation, le client souhaite apporter des modifications dans le projet, modifications qui ne figuraient pas dans la formulation du besoin initial.

Cet outil aidera le client à se prononcer, en toute connaissance de cause, sur la suite à donner. L'impact de ces modifications peut se traduire par des répercussions sur les coûts et sur les délais finaux.

En pratique :

À retenir :

La demande de modification est formulée par le client. Le chef de projet rédige la demande de modification qu'il adresse au client. La modification doit être validée par un référent client décisionnaire qui la retourne, acceptée ou refusée, au chef de projet.

Conseils :

La demande de modification est un outil pertinent dans la gestion de projet, mais elle doit être utilisée avec modération. Abuser des demandes de modification sur un même projet revient à remettre en question le cahier des charges initial qui a été présenté par le client, donc sa crédibilité.

N°	Date de demande	Sujet	Décision	Priorité	Stade d'évolution	Date	Remarque	Resp.
1	25/08/14	Suppression du convoyeur de chocolat. Déléguer l'opération à un sous-traitant	Non	3	A	27/08/14	Refus. Raison historique à présenter.	FB
2	26/08/14	Acquisition d'un transporteur par location	Non	2	C	26/08/14	Refus. Prix excessif. Solution ultime	FB
3	29/08/14	Modification du transporteur, procédé XT22	Oui	1	B	29/08/14	Acceptation. Solution justifiée.	FB

En pratique :

À éviter :

- Ne prenez pas en compte une modification sans pouvoir mesurer toutes les répercussions possibles sur l'ensemble du projet.

Principe :

- Le suivi des demandes de modification permet de recenser exhaustivement toutes les demandes relatives à un projet et d'en analyser les suites à donner.
- L'outil permet de hiérarchiser les modifications à apporter sous couvert de l'autorité compétente qui validera les modifications demandées.

XI – Outil de gestion de l'événement

Par événement dans la gestion de projet, nous entendons la valorisation du projet en début ou fin de cycle. Il s'agit d'une phase de communication du projet qui traite d'une action éphémère. Les événements dans la vie d'un projet sont nombreux et différents. Il peut s'agir de la cérémonie de clôture du projet, de l'inauguration d'un nouveau bâtiment, de l'opération de lancement d'un projet. Qu'ils concernent une action interne ou externe à l'entreprise, les événements liés à la gestion de projet ont tous un point en commun : une préparation minutieuse.

L'essentiel :

Outil de communication lié aux projets, la fiche-outil gestion de l'évènement vise à apporter une organisation professionnelle dans la réalisation de cette tâche en dissociant bien l'organisation de l'évènement du discours, moment clé de l'évènement.

Astuce :

- Ouvrir la composition du comité de pilotage aux différents services de l'entreprise (secrétariat, comptabilité, direction, marketing, services techniques) sans la surcharger.

Conseil :

Prendre le temps de gérer l'évènement :

- Continuer à faire vivre l'évènement après sa réalisation, cela revient à constituer une nouvelle Histoire de l'entreprise et à valoriser son action, sa marque.
- Privilégier les effets visuels à reproduire sur le Web (ne pas hésiter à filmer l'évènement) pour multiplier la captation.
- Prendre en compte les critiques liées à la gestion de cet événement, notamment sur le Web 2.0 (réseaux sociaux).

Outil de gestion de l'événement		Chef de projet: François BRECHINT		
Action : Inauguration de l'entreprise MACQEVOY Lieu : nouveaux locaux, Besançon		Budget prévu 90 000 €		
Groupe de travail - Répartition des tâches				
Direction	Discours			
Chef de projet	Organisation de l'événement – Suivi global			
Service communication et marketing	Relation presse – Rédaction des outils de communication – Discours – Réseaux sociaux			
Comptabilité	Facturation – Suivi budget			
Secrétariat	Constitution du fichier source - invitations			
Externalisation				
	Édition et impression de la brochure			
	Élaboration du film			
	Sonorisation-pupitre-estrade			
	Décor scénique			
	Organisation collation			
Objectifs à atteindre				
Nombre d'invités: 2 000 (résultats attendus 60 %) – Satisfaction des invités – Respect du budget alloué- Retombées presse (couverture nationale et régionale) – Valorisation de la marque MACQEVOY				
Planning				
Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Constitution du groupe de travail	Consultation des entreprises	Choix des entreprises	Préparation du discours	Suivi Web
Définition du projet		Point presse	Envoi du dossier presse	Gestion technique
Choix du lieu		Annonce dans les réseaux sociaux	Suivi Web	Test
Constitution du fichier source (invités, presse)			Gestion technique	Finalisation des discours

Suivi du budget				
Résultat de la consultation : 49 122 € - Coût interne : 30 000 €				
Résultat consultation	Avril	Mai	Juin	Juillet
Accolity 'Com : 32 000 € Vidéoscop SA : 9 000 € Tertio matériel : 2 000 € Fleurs Edouard : 1 524 € Maurice Traiteur : 4 598 €	Acomptes délivrés aux entreprises 20 % : 9 824,40 €		Facturation solde : 39 298 €	
Analyse de la performance				
Coût final	79 122 €			
Analyse quantitative (questionnaire)	Échantillon : 58	Face-à-face Téléphone Auto-administré		Questionnaire
Analyse qualitative (entretien)	Échantillon : 7	Entretiens Table-ronde		Groupe de travail Débriefing

XII – Fiche de suivi de production

Une fois la planification du projet réalisée et avant de démarrer la production du projet, il y a lieu d'élaborer une fiche de suivi de production. Cet outil est à usage interne. Réalisé par le chef de projet, il est destiné à l'équipe projet. Ce document n'a pas pour objet d'être transmis au client.

1. Objectif

Il s'agit, via cet outil, de respecter les objectifs de production afin de garantir le succès du projet. Le but premier est de sensibiliser l'équipe projet sur les avancées ou les retards pris au cours de la réalisation du projet. Cet outil doit permettre d'engager une procédure de rattrapage, quand c'est possible.

MDP SA Chef de projet : François BRECHINT	Fiche de suivi de modification										Référence : CAB.256.MDP5A	Date de démarrage du projet : 19 avril 2014
Identification de la phase	Identification de la ressource	État	Production démarrée		Degré d'achèvement %	Production finie		Solde calendaire		Validation interne	Validation client	
			Date planifiée	Date réelle		Date planifiée	Date réelle	Avancée + Retard – (jours)	Solde			
Phase 1	F.BR	Réalisée	19 avril 2014	19 avril 2014	100	22 avril 2014	23 avril 2014	-1	-1	x	x	
Phase 2	F.BR	Réalisée	23 avril 2014	26 avril 2014	100	7 mai 2014	6 mai 2014	+1	0	x	En cours	
Phase 3	A.DU	En cours	10 mai 2014		90	11 mai 2014						
Phase 4	F.BR	En cours	12 mai 2014		60	14 mai 2014						
Phase 5	D.HI	RAF	17 mai 2014		0	20 mai 2014						
Phase 6	D.HI	RAF	21 mai 2014		0	28 mai 2014						
Approche globale												
Phase(s) réalisée(s)	2/6											
Phase validée en interne	2/6											
Phases en cours d'achèvement	2/6											
Phase(s) non démarrée(s)	2/6											
Phase(s) validée(s) par le client	1/6											
Phase annulée	0/6											

À savoir

- Outil réalisé par le chef de projet à l'attention de l'équipe projet.
- Son objectif : sensibiliser l'équipe sur l'avancement du projet et pallier le retard éventuel.

XIII – Suivi des non-conformités

La non-conformité se définit comme étant la non-satisfaction à une exigence. Cet outil est donc nécessaire lorsqu'une exigence ne répond pas aux attentes et suscite un besoin de suivi en vue d'une résolution. Pour autant, dans le cadre d'un projet, toute non-conformité ne fait pas nécessairement l'objet de l'ouverture d'une fiche. Néanmoins, certains cas particuliers peuvent inciter à réaliser une trace pour suivre et régler définitivement une difficulté connue comme, par exemple, la mise en route d'une ligne de production.

La fonction principale de ce document est donc de rassembler l'ensemble des défaillances de conformités rencontrées au cours d'un projet. Constamment mis à jour, ce document projet peut faire l'objet d'un document livrable dans le cadre d'un plan qualité.

En pratique :

À éviter :

Tout comme le suivi de la documentation, le suivi des non-conformités, ne peut être pertinent que s'il est mis à jour tout au long du projet.

Principe :

Un outil de suivi est, par principe, en constante évolution au cours d'un projet. Il sert tout au long du projet et doit donc impérativement être tenu à jour à chaque évolution

L'essentiel :

- Cet outil est nécessaire lorsqu'une non-conformité est détectée et nécessite un suivi pour la résoudre.
- Toute détection ne fait pas nécessairement l'objet de l'ouverture d'une fiche de non-conformité.

Numéro	Référence	Date de constat	Sujet	État	Date de clôture	Responsable suivi	Classification	Fiche de non-conformité	Commentaires
P.14.01	CDC ¹	08/02/2014	Ventilateur droit	En cours		Sylvain DUMONT	Investissement	P.8	L'insuffisance de puissance du ventilateur induit une mauvaise circulation d'air dans l'atelier d'assemblage
P.14.02	BL ²	08/03/2014	Vanne endommagée	Clos, terminé	03.09.2014	Sylvain DUMONT	Maintenance	Non	La nouvelle vanne de régulation des eaux usées a subi un choc lors de son transport
P.14.03	NF XXX	06/05/2014	Veilleuse d'évacuation	À faire		Stéphanie MARCHAND	Maintenance	P.14	Les veilleuses «Sortie de secours» ne sont pas suffisamment visibles dans les couloirs du 1er étage du bâtiment de la direction générale

Données du formulaire	Instructions
SECTION A – Données de l'incident: description des détails de l'incident (Rempli par le responsable des investigations.)	
Incident n°...	Nous recommandons une numérotation composée : Incident n° XX-YY-ZZ où XX = Code interne du département projet YY = Deux derniers chiffres de l'année ZZ = Nombre séquentiel débutant avec le n° 01 Exemple : NE-04-05
Date incident	Date à laquelle l'incident a été identifié
Date actuelle	Date de début de rédaction du formulaire
État	• En cours – Incident en investigation • Action supplémentaire requise – Voir action(s) préventive(s) ci-dessous. • Terminé – Investigation terminée. Plus d'action corrective requise.
Reportable Oui Non	Rempli par le responsable projet si les investigations révèlent un problème important de sécurité ou suffisant pour en informer la direction. Le responsable projet doit s'assurer que les remarques appropriées sont faites.
Description	Faire une description complète de l'incident: il faut inclure la durée, les fonctions des personnes concernées (pas les noms) et les détails dans l'ordre chronologique.
Département(s) concerné(s)	Identifier tous les départements concernés, par exemple : PJ = Projet PR = Production MA = Maintenance
Responsable investigation Responsable département concerné	Identifier le responsable des investigations ou du département.

Données du formulaire	Instructions
SECTION B – Résultats des investigations (Rempli par le responsable des investigations ou le responsable de service.)	
Détails	Donner les détails de l'investigation : les actions prises, les personnes interrogées, etc. Joignez tous les documents annexes nécessaires.
Origine de l'incident	Faire la description des causes primaires de l'incident, c'est-à-dire les sources/origines qui, corrigées, élimineront le problème.
Cause(s) liée(s)	Faire la description des autres causes liées à l'incident, c'est-à-dire les causes qui y ont contribué mais qui, en elles-mêmes, n'ont pas généré l'incident.
Action(s) corrective(s)	Donner une description des actions immédiates prises pour résoudre l'incident.
Action(s) préventive(s)	Décrire les actions immédiates pour corriger l'origine de l'incident et éviter la récurrence du problème. Les actions préventives ne sont peut-être pas nécessaires si les actions correctives ont agi sur la cause de l'incident. Une fois l'établissement de l'action corrective fait, soumettre l'action pour vérification (si demandée) et/ou revue/approbation. Si l'action est étendue dans le futur, compléter la section C.
Consolidation du savoir	Résumer les leçons retenues de l'incident.
Responsable investigation Responsable département concerné	Identifier les responsables des investigations et du département concerné (production ou qualité par exemple)

XIV– Fiche de tâche

Dans un groupe projet, il est nécessaire de formaliser les différentes tâches à réaliser par l'ensemble des collaborateurs associés au projet. En effet, de nombreux projets sont voués à l'échec parce qu'on n'a pas clairement responsabilisé l'équipe projet en clarifiant les rôles de chacun selon les objectifs à atteindre. La fiche de tâche permet de pallier ce manquement.

En animant son équipe, le chef de projet délègue des tâches aux différents collaborateurs. Ces tâches doivent être clairement identifiées en faisant apparaître les variables qui/quand/comment, sans négliger les variables de durée et de lieu de réalisation. Cet outil permet ainsi :

- d'identifier le responsable de la tâche ;
- de définir les objectifs attendus ;
- de préciser les échéances ;
- d'identifier les moyens mis en œuvre ;
- d'identifier la tâche dans la globalité du projet.

L'outil permet également d'associer le collaborateur dans la réussite de l'opération en le faisant apparaître comme un maillon essentiel du projet.

FICHE DE TÂCHE								
	Avant-projet	Définition	Conception	Réalisation	Tests	Mise en service	Communication	Bilan
Tâche n°	1	2	3	4	5	6	7	8
Sous-tâches	Analyse du cahier des charges (CDC)	Propositions de l'équipe projet Calcul du prix de revient Évaluation des risques	Définition de l'offre Réunion client/prestataire	Ergonomie Analyse textuelle Animation virtuelle Traductions Vérifications	Tests Envoi client Modification Retour client Validation	Hébergement Référencement	Communiqué de presse Annonces légales Publication presse spécialisée	Évaluation Enquête de satisfaction
Qui	FB	GT-HV-FB	FB	BN- FR	CO	CO	FB	FB

PROJET : Site Internet de l'Unité de microtechnique horlogère de Pontarlier (39)		N° 4	Client : UMH Pontarlier
TÂCHE : RÉALISATION			Chef de projet : François BRECHINT
Sous-tâche: ERGONOMIE			
Description : Définition de l'ergonomie du site Internet		Objectifs à atteindre : Finalisation de la sous-tâche avant l'intégration textuelle prévue pour le 1 ^{er} juin	
Commentaire (rappel) : Le client souhaite une approche ergonomique novatrice où le site Internet conjugue authenticité du terroir franc-comtois et dynamisme technologique de l'entreprise. La charte couleurs de l'entreprise n'est pas à respecter. Possibilité nous est donnée de définir un nouveau logo pour l'entreprise.			

Thèmes et mots clés abordés durant cette phase : Authenticité Création Innovation Délais Organisation		Sources d'informations/Outils : CDC Fiches idées	
Livrable	PROJECTION AU GROUPE PROJET	Origine FB	
Délais	17 mai 2014 : 1re proposition 31 mai 2014 : présentation finale	Destinataire : groupe projet Destinataire : groupe projet	
Modèle			
Présentation	Date : 31 mai 2014 Durée : 20 minutes + 10 minutes questions – réponses Support : Dreamweaver ¹		
Auteur	Date de transmission	Destinataire	Charge estimée
François BRECHINT	02/05/14	Gérard CLAUD	5 J/h

XV – Outil décisionnel

La fiche idée a été remplie mais plusieurs solutions se présentent. Comment choisir en tenant compte de l'ensemble des critères de sélection ? Ou encore, comment choisir le meilleur fournisseur à partir des devis ? Décider est une action qui peut s'avérer difficile et comparer des solutions proposées par différents prestataires, sans outil d'aide à la décision, peut être hasardeux. Comment justifier une prise de position auprès de sa hiérarchie ? Un outil décisionnel permet d'optimiser la sélection d'un prestataire dans un contexte concurrentiel et de justifier son choix auprès de sa hiérarchie.

Il s'agit de regrouper les acteurs du projet à qui vous demanderez d'affecter une notation à différentes solutions, au regard de critères que nous allons énumérer.

		Coefficients d'Importance (CI) attribués (1-10)		
		Chef de projet	Responsable production	Responsable qualité
Critères jugés importants pour la prise de décision	PRIX	6	3	3
	PRISE DE RISQUE	8	9	9
	TEMPS D'ARRÊT LIGNE	5	9	2
	RÉVERSIBILITÉ	9	4	2
Coefficient Multiplicateur (CM)		2	3	1
Valeur Attribuée (VA = CI x CM)	PRIX	12	9	3
	PRISE DE RISQUE	16	27	9
	TEMPS D'ARRÊT LIGNE	10	27	2
	RÉVERSIBILITÉ	18	12	2
Moyenne (VA totale pour l'ensemble des décideurs)	PRIX	24		
	PRISE DE RISQUE	52		
	TEMPS D'ARRÊT LIGNE	39		
	RÉVERSIBILITÉ	32		
		Solution 1 15 000 €	Solution 2 80 000 €	Solution 3 100 000 €
Véracité du critère (VC) (0-10)	PRIX	8,5	2	0
	PRISE DE RISQUE	2	7	10
	TEMPS D'ARRÊT LIGNE	2	5	10
	RÉVERSIBILITÉ	0	5	8

L'essentiel :

- Cet outil peut s'utiliser dans tous les domaines où une prise de décision difficile est à prendre.
- Un outil d'aide à la décision ne donne pas un résultat indiscutable.
- Un outil d'aide à la décision n'est que le reflet de votre opinion et éventuellement de celles d'autres décisionnaires ; ne le présentez pas comme une science exacte.

XVI – Gestion des idées

L'amélioration continue et le flux d'idées sont difficilement hiérarchisables. Ainsi, pour pouvoir travailler sur les points les plus importants en priorité, il faut pouvoir chiffrer leur importance. Pour ce faire, nous utiliserons deux concepts l'un appelé AMDEC (Analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité) et l'autre, la fiche idée.

1. AMDEC

Grâce à cet outil, on peut identifier, évaluer et hiérarchiser les défaillances des différents composants d'un système (machine, installation, instrument, etc.), mais également optimiser les mises en route. L'AMDEC utilise les trois critères suivants :

1. L'importance.
2. La détection.
3. La fréquence.

Indice	Importance		Détection	Fréquence
	Temps de non-production	Déchets et sous-qualité	Avant l'apparition du problème	
1	Problème sans arrêt de production	Pas de déchet ou de sous-qualité	Problème détectable sans aucune surveillance, suffisamment tôt pour agir en prévention	Moins d'une fois par an
2	Problème sans arrêt de production	Pas de déchet ou de sous-qualité	Problème détectable sans aucune surveillance, suffisamment tôt pour agir en prévention	Environ 4 fois par an
3	Baisse de vitesse, 1 minute = 40 €	Environ 25 kg = 0 €	Problème détectable sans aucune surveillance mais juste à temps pour agir en prévention	Environ 10 fois par an
4	Environ 5 minutes = 120 €	Environ 100 kg = 120 €		Environ 1 à 2 fois par mois
5	Environ 5 minutes = 120 €	Environ 250 kg = 400 €		Environ 1 à 2 fois par mois
6	Environ 1 heure = 1 300 €	Environ 800 kg = 1 300 €	Problème détectable uniquement avec plan de surveillance	Environ 1 à 2 fois par semaine
7	Environ 1 heure = 1 300 €	Environ 2,5 tonnes = 4 000 €	Problème détectable uniquement avec plan de surveillance	Environ 2 à 3 fois par semaine
8	Environ 10 heures = 1 200 €	Environ 7,5 tonnes = 13 000 €	Problème difficile à détecter avant son apparition	Environ 5 fois par semaine
9	+ ou - 1 jour = 25 000 €	Environ 15 tonnes = 25 000 €	Problème difficile à détecter avant son apparition	Environ 1 fois par jour
10	Plus de 2 jours > 60 000 €	Plus de 40 tonnes > 60 000 €	Problème subit sans aucun signe précurseur	Plus d'une fois par jour

Ligne n° 5					Situation de départ				Situation future estimée			
Objectif	Machine	Leader	État	Situation actuelle	I	D	F	NRP	I	D	F	NRP
Particules noires ou fibres sales générant des déchets et retours clients	Cardes	DDH	2	Mise en place de caméras à l'enrouleuse avec traitement de l'image	7	10	6	420	7	10	4	280
Détections incendie en ligne générant des arrêts ligne intempestifs + bourrages dus aux dimensions des réceptacles de fibre	Ouvraison	ERP	4	Courrier envoyé à l'installateur, réponse pour semaine 12 ; remplacer les réceptacles de réception de fibre par de plus grands et augmenter le niveau d'humidité de l'air dans la zone d'ouvrison	6	10	6	360	4	10	2	80
Traitement des rognures générant des déchets dès qu'un des coupeurs se met en défaut (éjection de la bobine de flan)	Bobineuse	ASP	2	Installer le même système que celui sur la ligne 2	4	10	9	360	1	1	1	1
Problème d'aspect de voile dû au mauvais fonctionnement du prémouilleur lorsqu'il est encrassé	Liage	ERP	1	20/02/11 – Enregistré en tant que nouveau point. Changer le prémouilleur lors des opérations de maintenance préventives. AKH marque la position idéale du prémouilleur	5	10	7	350	4	6	1	24
Légende I = Importance ; D = Détection ; F = Fréquence ; NRP = Nombre de risques prioritaires État 0 = simple enregistrement du point ; 1 = Prétude ; 2 = Étude ; 3 = Mise en place ; 4 = Suivi avant validation finale ; 5 = Point terminé ; 6 = Point clos avant finalisation.												

2. La fiche idée

La fiche idée est destinée à favoriser l'émergence de nouvelles idées tout en proposant une démarche participative au sein du personnel. Elle sert à collecter des informations auprès des collaborateurs de l'entreprise dans l'objectif de les faire remonter vers les services concernés (bureau d'études, maintenance...). Cette fiche doit être à la fois simple et conviviale pour l'utilisateur et facilement lisible par le destinataire. Quelle que soit la suite donnée à l'idée, son auteur doit en être informé.

En pratique :

À éviter :

Il ne faut pas :

- Oublier de donner une suite aux idées formulées par les collaborateurs.
- Élaborer un outil trop complexe et d'une compréhension difficile.

Principe :

Outil de participation à la vie de l'entreprise ou d'un projet, la fiche idée permet la réalisation d'évolutions positives dans le projet en invitant les collaborateurs à transmettre leurs idées. Il est indispensable d'informer le géniteur de l'idée des suites réservées à son intervention.

Astuce :

Pour être utilisées, ces fiches idées doivent être accessibles. Un dépôt de fiches idées à un ou deux emplacements clés dans l'entreprise et un mailing avant le lancement du projet mobilisent les collaborateurs à participer à cette aventure collective.

L'essentiel :

- La fiche idée doit être simple à compléter.
- Encourager les utilisateurs à ne pas hésiter à remplir des fiches régulièrement.
- Toujours informer des suites données aux idées proposées.

XVII – Suivi de la documentation

Tout au long du projet, des informations (notices techniques, manuels de référence et manuels de maintenance) sont échangées entre l'équipe projet et différents interlocuteurs (un ou plusieurs clients, le groupe projet, les équipes techniques, les fournisseurs) intervenant dans le projet. À chaque correction, mise à jour ou évolution, il convient de redistribuer l'ensemble de la documentation à tous les utilisateurs. Il arrive même souvent que le chef de projet soit amené à reprendre des descriptions alors qu'elles ont déjà fait l'objet d'un écrit. Pour éviter perte de temps, redondance des travaux, perte de crédibilité, une gestion même sommaire de la documentation permet au chef de projet d'être efficace dans toutes les situations relatives aux échanges de documents.

Cet outil rassemble donc l'ensemble de la documentation produite et échangée dans le cadre du projet. Constamment mis à jour, ce document projet peut faire l'objet d'un document livrable dans le cadre d'un plan qualité. Sa fonction principale est de dresser un inventaire de toute la documentation créée et échangée dans le cadre du projet.

Son rôle est de pouvoir identifier rapidement la référence de classement de la documentation, d'assurer le suivi des mises à jour, d'identifier les destinataires et d'avoir un

résumé succinct du contenu. Pour assurer une bonne utilisation de l'outil nous pouvons distinguer deux catégories d'information : les éléments indispensables et les éléments optionnels.

- **Éléments indispensables**

De manière à donner un tant soit peu d'intérêt à l'outil, quelques informations sont nécessaires :

Le nom – Le nom complet du document se trouve en général sur la page de garde du document. Le nom peut aussi faire référence à une codification liée au projet, à l'entreprise ou tout simplement à une norme.

La date – Cette dernière peut être soit la date de création initiale du document soit la date de mise à jour de ce même document.

La version – Il s'agit d'un numéro chronologique permettant de conserver une trace des modifications successives apportées à un document.

l'auteur – Il faut indiquer le nom de la personne ayant réalisé la création ou la modification relative au numéro de version.

Ref. n°	Nom	Support	Date	Version	Auteur	Validation	État	Remarque	BTPAL SA (Jean F.)	ÉLECTRO SA (Dominique M.)
1	Module utilisateur	Papier	01/06/13	1.00.00	Antoine C.	François B. Stéphanie M.	Transmis	Version initiale	01/07/13	
2	Module administrateur	.doc	15/06/13	1.00.00	Antoine C.	François B. Stéphanie M.	Transmis	Version initiale	01/07/13	
3	Module serveur	.doc	22/06/13	1.00.00	Antoine C.	François B. Stéphanie M.	Transmis	Version initiale	01/07/13	
4	Module administrateur	.doc	15/07/13	1.00.01	Antoine C.	François B.	Transmis	Évolution technique mineure	01/08/13	
5	Module administrateur	.doc	25/08/13	1.00.02	Antoine C.	François B.	Transmis	Évolution technique mineure	01/09/13	
6	Module serveur	.doc	22/09/13	1.01.00	Antoine C.	François B.	Modif. en cours	Correction	01/10/13	
7	Module administrateur	.doc	25/09/13	1.01.00	Antoine C.	François B.	À valider	Correction	01/10/13	
8	Module utilisateur	.doc		1.01.00	Antoine C.	François B.	À faire	Correction	01/10/13	
9	Module utilisateur	Papier		1.02.00	Antoine C.	Stéphanie M. François B.	À faire	Évolutions fonctionnelles	06/01/14	06/01/14
10	Module serveur	.doc		1.02.00	Antoine C.	Stéphanie M. François B.	À faire	Évolutions fonctionnelles	06/01/14	06/01/14
11	Module administrateur	.doc		1.02.00	Antoine C.	Stéphanie M. François B.	À faire	Évolutions fonctionnelles	06/01/14	06/01/14

XVIII – Suivi des litiges

La fiche de suivi des litiges est un document officiel qui permet d'établir la responsabilité d'un prestataire lors d'un problème d'exécution pouvant être réglé à l'amiable. Avec cet outil, il sera possible de répertorier les litiges, de collecter les informations de coûts et de posséder une interface officielle entre le client et le fournisseur. Deux documents distincts permettent de suivre l'évolution du litige :

- Le premier contient les procédures qui permettent de répertorier l'objet du litige, de déterminer les responsabilités de chacun, de gérer le litige et d'affecter les différentes mesures à suivre pour pallier le problème.
- Le second est un formulaire permettant de préciser l'objet du litige, sa gravité, d'indiquer les répercussions financières, les actions correctives envisageables et les dédommagements demandés et perçus.

Bien entendu, cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une procédure simple.

Procédure pour traitement des litiges techniques		
Étapes	Acteurs	Actions
1 Détection	Production/Maintenance/Engineering	
2 Formalisation des faits et identification des responsabilités	Engineering/Maintenance/Achats	Rédiger une description détaillée du défaut ou non-conformité
3 Actions correctives immédiates	Production/Maintenance/Engineering	Implantation d'une solution de secours pour poursuite de l'activité
4 Expertise externe (en fonction des enjeux)	Maintenance/Engineering/Achats	Argumentation technique du défaut ou de non-conformité Choix du cabinet et négociation du contrat
5 Quantification du préjudice	Production/Maintenance	Pertes subies : kg de matières premières, kg de produits finis, heures de production, main-d'œuvre Ressources employées : main-d'œuvre (interne ou externe) et matières

6	Évaluation du préjudice	Contrôle gestion/Finances	Calcul des produits : quantité x coût
7	Procédure de réclamation auprès du fournisseur	Achats	Engagement de la procédure en transmettant le dossier complet et négociation jusqu'à obtention : – des actions correctives définitives (+ service technique) – des dédommagements financiers satisfaisants – clôture du dossier
8	Actions correctives définitives	Services techniques/ Achats	Validation de la solution retenue, de l'imputation des coûts Négociation et validation de l'imputation des coûts
9	Clôture du dossier	Production/Maintenance/ Engineering	Actions correctives satisfaisantes, évaluées sur un test ou une période

XIX – Suivi des correspondances écrites

En cas d'imprévu, le chef de projet doit être capable de réagir rapidement. S'il est ordonné et rigoureux, son efficacité ne sera que plus grande. Dans le cadre d'un projet, la gestion de la communication entre un prestataire et un client revêt une importance toute particulière, tout spécialement dans le suivi du courrier et des télécopies, sans oublier les mails.

N° courrier	Date d'envoi	Date de réception	Type de support	Destinataire	Expéditeur	Société destinataire	Classification	Copie interne	Résumé
1	02/05/14		Lettre	MARTIN F.	BRECHINT F.	BTPAL SA	Devis	JJ ; MJ	Demande d'un devis pour l'installation d'une nouvelle chaudière
2	02/05/14		E-mail	DUPOND M.	BRECHINT F.	ÉLECTRO SA	Devis	JJ ; MJ	Demande d'un devis pour l'installation d'une nouvelle chaudière
3	02/05/14		Lettre	PORTAL E.	BRECHINT F.	ESTCHAU SA	Devis	JJ ; MJ	Demande d'un devis pour l'installation d'une nouvelle chaudière
4		15/05/14	Fax	BRECHINT F.	DUPOND M.	FreeBoat	Devis	JJ ; MJ	Réponse devis de la société ÉLECTRO SA
5		18/05/14	Fax	BRECHINT F.	PORTAL E.	FreeBoat	Devis	JJ ; MJ	Réponse devis de la société ESTCHAU SA
6		20/05/14	Fax	BRECHINT F.	MARTIN F.	FreeBoat	Devis	JJ ; MJ	Réponse devis de la société BTPAL SA
7	22/05/14		Lettre	DUPOND M.	BRECHINT F.	ÉLECTRO SA	Accord	JJ ; MJ	Demande de démarrage des travaux
8	07/06/14		Lettre AR	DUPOND M.	BRECHINT F.	ÉLECTRO SA	Recette	JJ ; MJ	Recette et validation des travaux chaudière
9		10/06/14	Lettre AR	BRECHINT F.	DUPOND M.	FreeBoat	Facture	JJ ; MJ	Réception de la facture d'installation du chauffage
10	16/06/14		Lettre AR	DUPOND M.	BRECHINT F.	ÉLECTRO SA	Recette	JJ ; MJ	Envoie paiement montant facture

XX – Suivi financier

La réussite du projet passe également par une bonne gestion du budget. Nous noterons que l'outil de suivi financier permet de planifier dans le temps les montants des dépenses du projet, de suivre les éventuelles dérives, de connaître à tout moment l'état d'un paiement, de consolider le savoir en retrouvant facilement les coûts des dépenses a posteriori.

Tableau prévisionnel :

Prévisions								
Projet	TBF10							
Titre	Chaufferie							
Devise	EUR HT	Budgété	01/02/14	01/03/14	01/04/14	01/05/14	01/06/14	
1.1. Process								
1.1.01	Brûleurs		26560					
	2 brûleurs	7 500		750	1 500			
	Coûts additionnels	2 000				200		
	Montage	3 500			525			
	Mise en route	1 000						300
	Mise en route	520						156
	Formation maintenance	8 840						884
	Cheminée	3 200						
	Pièces de rechange	0						

Suivi des dépenses :

Suivi des dépenses																			
Projet	TBF10	Titre	Chaufferie																
				Engagement	Total Contrat	Paiements	N° compte	Total payé	Reste	Garantie bancaire									
1.1. Process				1.1. Process															
1.1.01.0	Kesreris	Brûleurs		Principal	27000	27744	10 % signature	2 700	37 293	16 944	10 800	reçu				2 700			
							10 % livraison	2 700	37 293				reçu						
							30 % livraison solde	8 100	37 293				non						
							10 % réception technique	2 700	37 293				non						
							20 % réception finale		37 293				non						
							20 % fin garantie	2 000	37 293				non						
				Sup 1	2 000		Facture	-1 256	37 412				non						
				Sup 2	-1 256		Avoir (dommages)												
1.1.01.0	Sur facture Weber Menger					1 17		1 439	37 405	1 817	0		non						
						378		378	37 406				non						
1.1.02.0	Engricht	Citermes		Principal	32500	37 522	30 % commande	9 750	37 308	37 522	0		non			9 750		1 620	
							50 % installation	16 250	37 308				non						3250
							10 % mise en route	3 250	37 308				non						
							10 % fin garantie	3 250	37 308				non						
				Sup 1	5 022		90 % livraison	4 520	37 322				non					4 520	
							10 % acceptation	502	37 322				non						502

Suivi du budget :

Suivi de budget									
Projet	TBF10	Budget		Dépenses		Déviations			
Titre	Chaufferie								
Monnaie	EUR HT	Détails	Montants	Commentaires	Engagé ou dépensé	Restant (estimation)	Total	EUR	%
1.1. Process									
1.1.01	Brûleurs		26560		18761	10000	28761	-2201	-8
	2 brûleurs	7500							
	Coûts additionnels	2000							
	Montage	3500							
	Mise en route	1000							
	Formation maintenance	520							
	Cheminée	8840							
	Pièce de rechange	3200							
		0							
1.1.02	Citernes		35800		37522	0	37522	-1722	-5

XXI – Observation de situation dangereuse ou presque accident

Tout projet présente un potentiel de risques ; ce qui ne se traduit pas automatiquement par un accident, bien heureusement. Toutefois, suite à un accident, on s'aperçoit souvent que la situation s'était déjà présentée, même si elle n'avait pas eu de conséquence, et que, si on y avait remédié à ce moment-là, il n'y aurait peut-être pas eu de nouvel accident. Il s'agit donc ici de préparer une action préventive destinée à réduire les risques d'incident. Le Code du travail français (article L. 230-2) impose l'obligation de mettre en œuvre des mesures de prévention afin d'assurer la sécurité, de protéger la santé, d'éviter et d'évaluer les risques aux personnes qui ne peuvent être évités.

FICHE D'ÉVÉNEMENT SÉCURITÉ			
☒ Situation ou acte dangereux		☐ Presque accident	
☐ AT bénin			
Date de l'événement : 08/02/14 Heure : 9h45 Lieu de l'événement : TGBT Usine 2 Travaux en cours : Remplacement sectionneur et disjoncteur		Entreprise : MDP SA Personne concernée : FRANCOIS BRECHINT Fonction : Chef d'équipe NRJ 2 ☒ Statutaire ☐ Intérimaire ☐ Sous-traitant	
RÉCIT DE L'ÉVÉNEMENT (joindre un schéma si nécessaire)			
Lors de la mise en place d'un enregistreur de réseaux, précisément lors du positionnement d'une pince crocodile sur une phase du jeu de barres du TGBT 197-03-31, l'ouverture trop importante de la pince a permis le contact entre 2 phases, provoquant ainsi un court-circuit. La pince ayant très peu de matière métallique, l'arc électrique induit fut très bref et a provoqué très peu de dégâts matériels (même à la pince). Fort heureusement aucune incidence pour l'opérateur. Le disjoncteur général a déclenché.			
Nom du déclarant : F. BRECHINT		Noms des témoins : Marc BIDOIRE	
ACTIONS IMMÉDIATES (pour éviter l'accident ou le sur-accident)		Resp.	Délai
Consignation de la cellule et du transformateur associés alimentant ce même TGBT. Retrait des éléments de mesures déjà mis en place, nettoyage du jeu de barres et mesures d'isolement avant la remise en service du TGBT.		YDN	Imméd.
ANALYSE DES CAUSES			
>EPC* >EPI* >PP/PPSPS >Outillage >Habilitation Autorisation	Présent ☐ ☒ ☐ ☒ ☒	Utilisé ☐ ☒ ☐ ☒ ☒	Non-consignation de l'ouvrage Procédure utilisée pour l'opération non validée par la hiérarchie et le chef de site
ACTIONS CORRECTIVES ET PRÉVENTIVES (pour éviter la répétition de l'événement)		Resp.	Délai
- Consignation définitive du TGBT suite aux faibles valeurs d'isolement relevées. Déport des départs importants sur deuxième TGBT. - Réunion de sensibilisation au sein de l'équipe NRJ / ELA ce même jour (rappel du port obligatoire des EPI, même lors de la mise en place de dispositifs d'analyse et de mesure) - Inscription de l'intéressé à la formation initiale UTE C18-510 en avance de phase		YDN JMGI MBID	Imméd. S3/11 S10/11
Destinataires : Chef d'entreprise, animateur sécurité du réseau		Visa animateur sécurité :	

XXII – Causerie sécurité

La sécurité des personnes passe avant tout et un chef de projet qui ne met pas au premier plan la sécurité est irresponsable. On notera que lors d'un accident grave, voire mortel, les représentants de la loi chercheront des responsables. Ainsi, même si cet outil peut sembler rébarbatif et présenter une faible valeur ajoutée, il doit impérativement être inclus dans le déroulement du projet.

Point clé : En cas d'accident, l'outil causerie sécurité vous permettra éventuellement de faire valoir votre souci de la sécurité devant un juge. En effet, votre responsabilité individuelle peut être engagée en cas d'accident grave.

1. Objectif

La causerie sécurité a pour objet d'échanger des informations sécuritaires entre les ressources humaines du projet et la direction du projet. Cet outil permet aussi d'améliorer le comportement du personnel au regard des aspects sécuritaires.

Cette causerie intervient suite à un rapport d'audit sécuritaire, un accident ou presque accident du travail (voir l'Outil – Observation de situation dangereuse ou presque accident). Elle se fait à l'initiative du personnel, quel qu'il soit, lorsqu'un aspect sécuritaire sur le site change de manière importante et, dans tous les cas, elle a lieu de manière récurrente et régulière (hebdomadairement, mensuellement, par exemple).

2. Principe

Cette causerie ne doit pas se faire de manière désordonnée. Un objectif ou un thème est prévu et communiqué lors de la planification de la réunion. Celle-ci, qui ne doit pas durer plus d'une heure, est animée par le chef de projet, le responsable sécurité ou tout autre responsable selon un accord préalable. Toutes les personnes du site ou de l'entreprise travaillant sur le site y sont conviées. La présence de l'ensemble du personnel y est obligatoire. Pour animer la causerie, on peut utiliser des supports tels que des tableaux, des diapositives, des PowerPoint, des films de sensibilisation, etc.

La présentation est obligatoirement suivie d'une discussion où les assistants doivent se sentir libres de s'exprimer. Un rapport avec les éventuelles actions à engager est rédigé, et les participants qui ont signé la feuille de présence, en reçoivent individuellement une copie. Ces documents doivent être conservés au moins 3 ans après la clôture du projet, et plus en cas d'accident grave. S'il existe un animateur sécurité dans l'entreprise, on lui transmet une copie du document pour qu'il assure le suivi des actions prévues.

LOGO		CAUSERIE SÉCURITÉ									
Date : 25/07/2014 Animateur : François BRECHINT Projet : REDI 3 Site : CSG Kourou											
Sujet abordé : PRÉVENTION DU RISQUE AMIANTE											
SUPPORTS ET DOCUMENTS UTILISÉS - Présentation PowerPoint - Plans du CDL4 - Fiches d'intervention - Dernier audit 'amiante' client		PRÉSENTS:									
		Nom	Visa								
		Sébastien BOURDON									
		Marc BIDOIRE									
		Maurice SODA									
COMMENTAIRES DES PARTICIPANTS <i>Q - Comment sont traités les déchets amiantés dans la région ?</i> R - La société "Colsec" est la seule autorisée à collecter ce type de déchets dans la région. <i>Q - Quels sont les éventuels lieux ou matériels contenant encore de l'amiante sur le site ?</i> R - Selon le dernier audit amiante réalisé par un organisme agréé, seuls les planchers suspendus contiennent de l'amiante. Il est interdit de les percer ou les découper sans autorisation. Toutefois, aucune mesure particulière n'est à prendre pour la manutention de ces plaques qui ne sont pas génératrices de poussières d'amiante.		Jean-Claude TAREAU									
		Didier PICHÉRY									
		Denis LHOMBREAUD									
		JF DE GRUTTOLA									
ACTIONS PRÉVENTIVES / CORRECTIVES DÉCIDÉES <table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTION (numéroter)</th> <th>QUI</th> <th>DATE</th> <th>RÉSULTAT ATTENDU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1) Affichage à l'entrée de l'atelier du plan des zones avec plancher suspendu et précautions à prendre</td> <td>FBR</td> <td>25/08/14</td> <td>Affichage simple</td> </tr> </tbody> </table>		ACTION (numéroter)	QUI	DATE	RÉSULTAT ATTENDU	1) Affichage à l'entrée de l'atelier du plan des zones avec plancher suspendu et précautions à prendre	FBR	25/08/14	Affichage simple		
		ACTION (numéroter)	QUI	DATE	RÉSULTAT ATTENDU						
		1) Affichage à l'entrée de l'atelier du plan des zones avec plancher suspendu et précautions à prendre	FBR	25/08/14	Affichage simple						
DIFFUSION Participants + Responsable sécurité		Visa animateur sécurité									

En pratique :

À éviter :

- Négliger cette réunion car, en cas d'accident grave, votre responsabilité individuelle risque d'être engagée.
- Réaliser cette réunion sans préalablement l'organiser : elle est utile pour préserver la sécurité et ne doit pas être faite dans le seul et unique but de se couvrir en cas d'accident.
- Négliger le suivi des actions.
- Faire des causeries trop longues risquant de décourager l'auditoire et de compromettre l'organisation de nouvelles causeries sécurité.

Principes :

Cet outil permet d'échanger sur les aspects sécuritaires : des employés vers le chef de projet et vice-versa.

Astuce :

Pour balayer l'ensemble des aspects sécuritaires, on réalise un planning de réunions régulières que chacune des équipes du projet pilotera tour à tour.

L'essentiel :

- Toujours placer l'aspect sécuritaire à la première place dans le projet.

- À mettre en œuvre régulièrement, mais aussi suite à un accident de travail ou lors d'une modification importante des aspects sécuritaires sur le site.
- Réunion à préparer soigneusement et à faire suivre d'un rapport.
- Obligation d'y associer l'ensemble du personnel du site.
- Transmettre une copie à l'ensemble du personnel ainsi qu'au responsable de la sécurité pour que ce dernier veille au suivi des actions correctives s'il y a lieu.
- Conserver les rapports pendant au moins 3 ans après la fin du projet, et plus en cas d'accident grave.
